Charte de projet

Journée portes ouvertes

Projet	Projet 1 – Charte et découpage d'un mini-projet interne
Cours	306 – Techniques de gestion de projets
Auteur / chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3
Commanditaire	Direction de l'entreprise (rôle tenu par le formateur, Morrad)
Version / date	1.0 – octobre 2026

1. Contexte

L'entreprise est une PME de 20 personnes. La direction veut organiser une journée portes ouvertes dans 6 semaines pour se faire connaître auprès de ses clients, de ses partenaires et du voisinage. Personne dans l'entreprise n'a encore organisé ce type d'événement, d'où le besoin de structurer le projet dès le départ.

2. Recueil des besoins auprès du commanditaire

Formateur absent. Le recueil des besoins devait se faire lors d'un entretien avec le commanditaire (le formateur). Comme il n'était pas présent, j'ai préparé les questions que je lui aurais posées et j'ai retenu pour chacune une réponse plausible qu'il aurait pu me donner pour une PME de 20 personnes. Toute la charte est construite sur ces réponses.

Question préparée pour le commanditaire	Réponse retenue (cas plausible)
Quel est le but principal de la journée (clients, recrutement, image, voisinage) ?	Se faire connaître et renforcer les liens avec les clients.
Quelle date est visée et quel jour de la semaine ?	Vendredi 27 novembre 2026, de 14h à 19h.
Combien de visiteurs sont attendus ?	Environ 80 personnes.
Quel budget est disponible ?	CHF 5'000 maximum.
Combien de collaborateurs peuvent aider, et combien de temps ?	Tous présents le jour J, 4 personnes dans l'équipe de préparation.
L'événement a-t-il lieu dans nos locaux ?	Oui, dans les locaux de l'entreprise.
Y a-t-il des choses à éviter ou des obligations (clients confidentiels, sécurité) ?	Les bureaux avec des dossiers clients ne sont pas visités.

3. Objectifs

- Accueillir au moins 80 visiteurs le jour J.
- Présenter les activités de l'entreprise avec au moins une démonstration par service.
- Obtenir au moins 70 % de visiteurs satisfaits ou très satisfaits (questionnaire de fin de journée).
- Rester dans le budget de CHF 5'000.
- Être prêt pour le jour J, soit 6 semaines après le lancement.


4. Périmètre

Inclus dans le projet	Exclu du projet
• Programme de la journée et animations • Invitations, annonce sur le site web et inscriptions • Aménagement des locaux, matériel et signalétique • Apéritif (traiteur) • Questionnaire de satisfaction et bilan	• Location d'une salle externe • Campagne publicitaire payante (journaux, affichage) • Travaux de rénovation des locaux • Cadeaux personnalisés pour les visiteurs

5. Parties prenantes

Partie prenante	Rôle dans le projet	Attentes
Direction	Commanditaire, valide la charte, le budget et le programme	Image de l'entreprise, budget respecté
Chef de projet (moi)	Organise, coordonne et suit le projet	Objectifs clairs, équipe disponible
Équipe de préparation (4 personnes)	Responsables programme, communication, logistique, informatique	Tâches claires et compatibles avec leur travail habituel
Collaborateurs	Présents le jour J, présentent leur service	Être informés suffisamment tôt
Visiteurs (clients, partenaires, voisins)	Public de l'événement	Accueil agréable, découvrir l'entreprise
Traiteur et fournisseurs	Restauration, matériel	Commande claire et dans les délais

Matrice pouvoir / intérêt. Pour savoir comment communiquer avec chacun, j'ai placé les parties prenantes sur une matrice pouvoir / intérêt (fichier *parties-prenantes-et-raci.xlsx*, la stratégie est calculée par formule). J'y ai ajouté la gérance de l'immeuble et le traiteur : ils s'intéressent peu au projet, mais ils peuvent le bloquer (accès, parking, repas). Il faut donc les garder satisfaits dès le début.

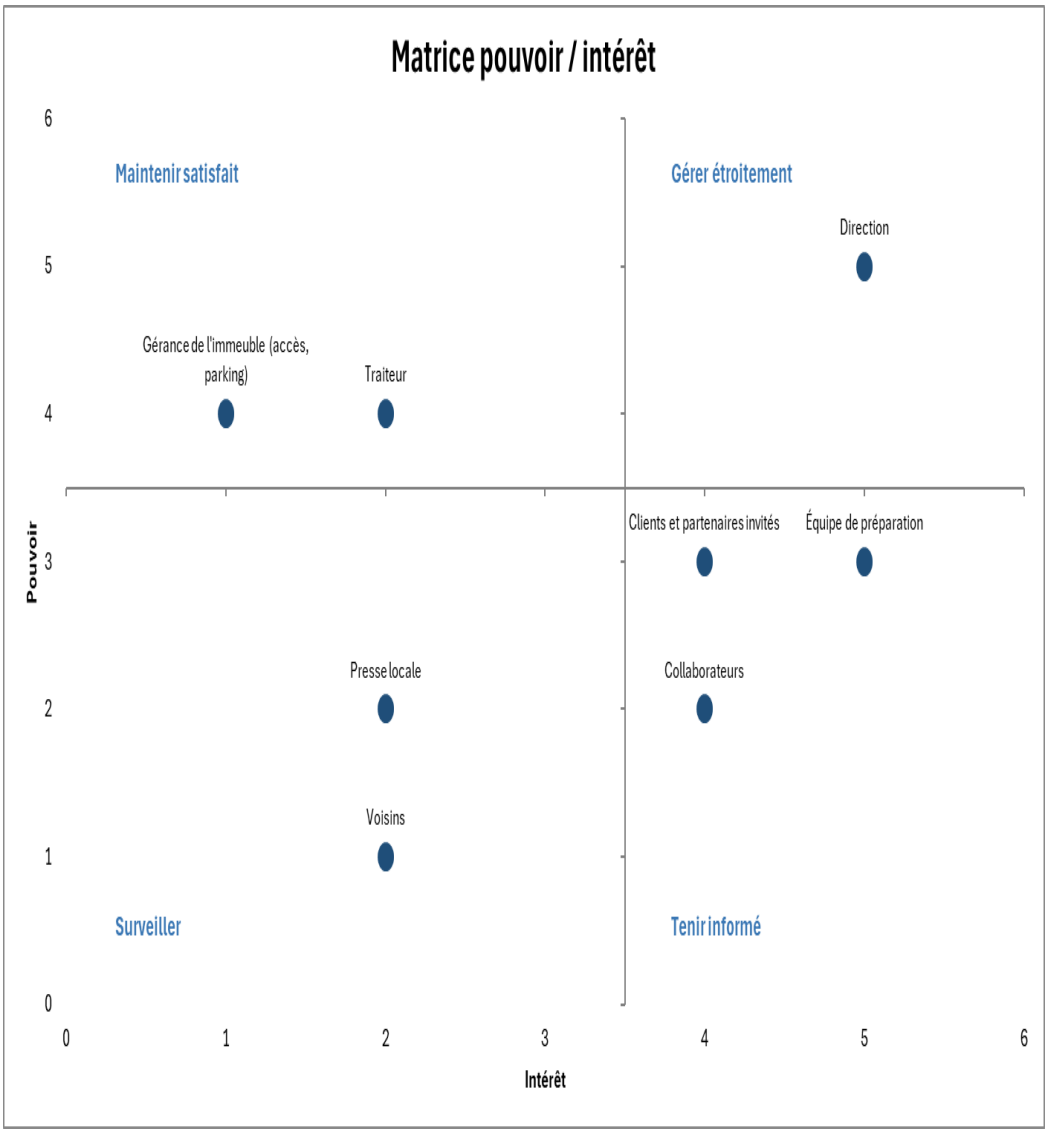

Rôles et responsabilités (RACI). Pour chaque grande activité, la matrice indique qui réalise (R), qui approuve (A, une seule personne), qui est consulté (C) et qui est informé (I). Une formule vérifie qu'il y a bien un seul A par ligne.

Activité	Direction	Chef de projet	Resp. programme	Resp. communication	Resp. logistique	Informaticien	Collaborateurs	Contrôle (un seul A)
Recueil des besoins et charte	A	R	C	C	C	I	I	OK
Validation du budget	A	R	I	I	I			OK
Programme de la journée	C	A	R	C	C	I	C	OK
Démonstrations par service	I	A	R	I	I	C	R	OK
Invitations et inscriptions	C	A	I	R	I	C	I	OK
Aménagement, mobilier, traiteur	I	A	C	I	R	C	I	OK
Matériel IT et Wi-Fi invités		A	C		C	R		OK
Répétition générale et jour J	I	A	R	R	R	R	R	OK
Questionnaire et bilan final	A	R	C	C	C	I	I	OK

6. Contraintes et risques principaux

- **Délai :** 6 semaines, sans possibilité de repousser la date une fois les invitations envoyées.
- **Budget :** CHF 5'000.
- **Ressources :** l'équipe travaille sur le projet en plus de son travail habituel.
- **Risques :** trop peu d'inscrits, traiteur indisponible, collaborateurs absents le jour J, panne du matériel de démonstration. Mesures prévues : relance des invités au jalon J5, devis demandés à deux traiteurs, planning de présence validé tôt, matériel testé lors de la répétition générale.

7. Livrables du projet


- Programme de la journée validé
- Invitations et formulaire d'inscription
- Locaux aménagés et matériel prêt le jour J
- Bilan final avec résultats du questionnaire

8. Découpage du projet (WBS)

Le projet est découpé sur 4 niveaux (niveau 0 à 3) dans le fichier Excel *wbs-et-jalons.xlsx*. Le niveau 3 correspond aux lots de travail, avec un responsable et une charge estimée. Les charges des niveaux supérieurs sont calculées automatiquement. Charge totale estimée : **25 jours de travail**.

Code	Partie (niveau 1)	Sous-parties (niveau 2)	Charge
1	Gestion de projet	Lancement, suivi, clôture	4 j
2	Programme et contenus	Programme de la journée, contenus	7 j
3	Communication	Externe, interne, inscriptions	4.25 j
4	Logistique	Locaux, matériel, restauration, sécurité	5.5 j
5	Jour J	Préparation, déroulement, après l'événement	4.25 j

Détail complet du WBS (niveau 3) :

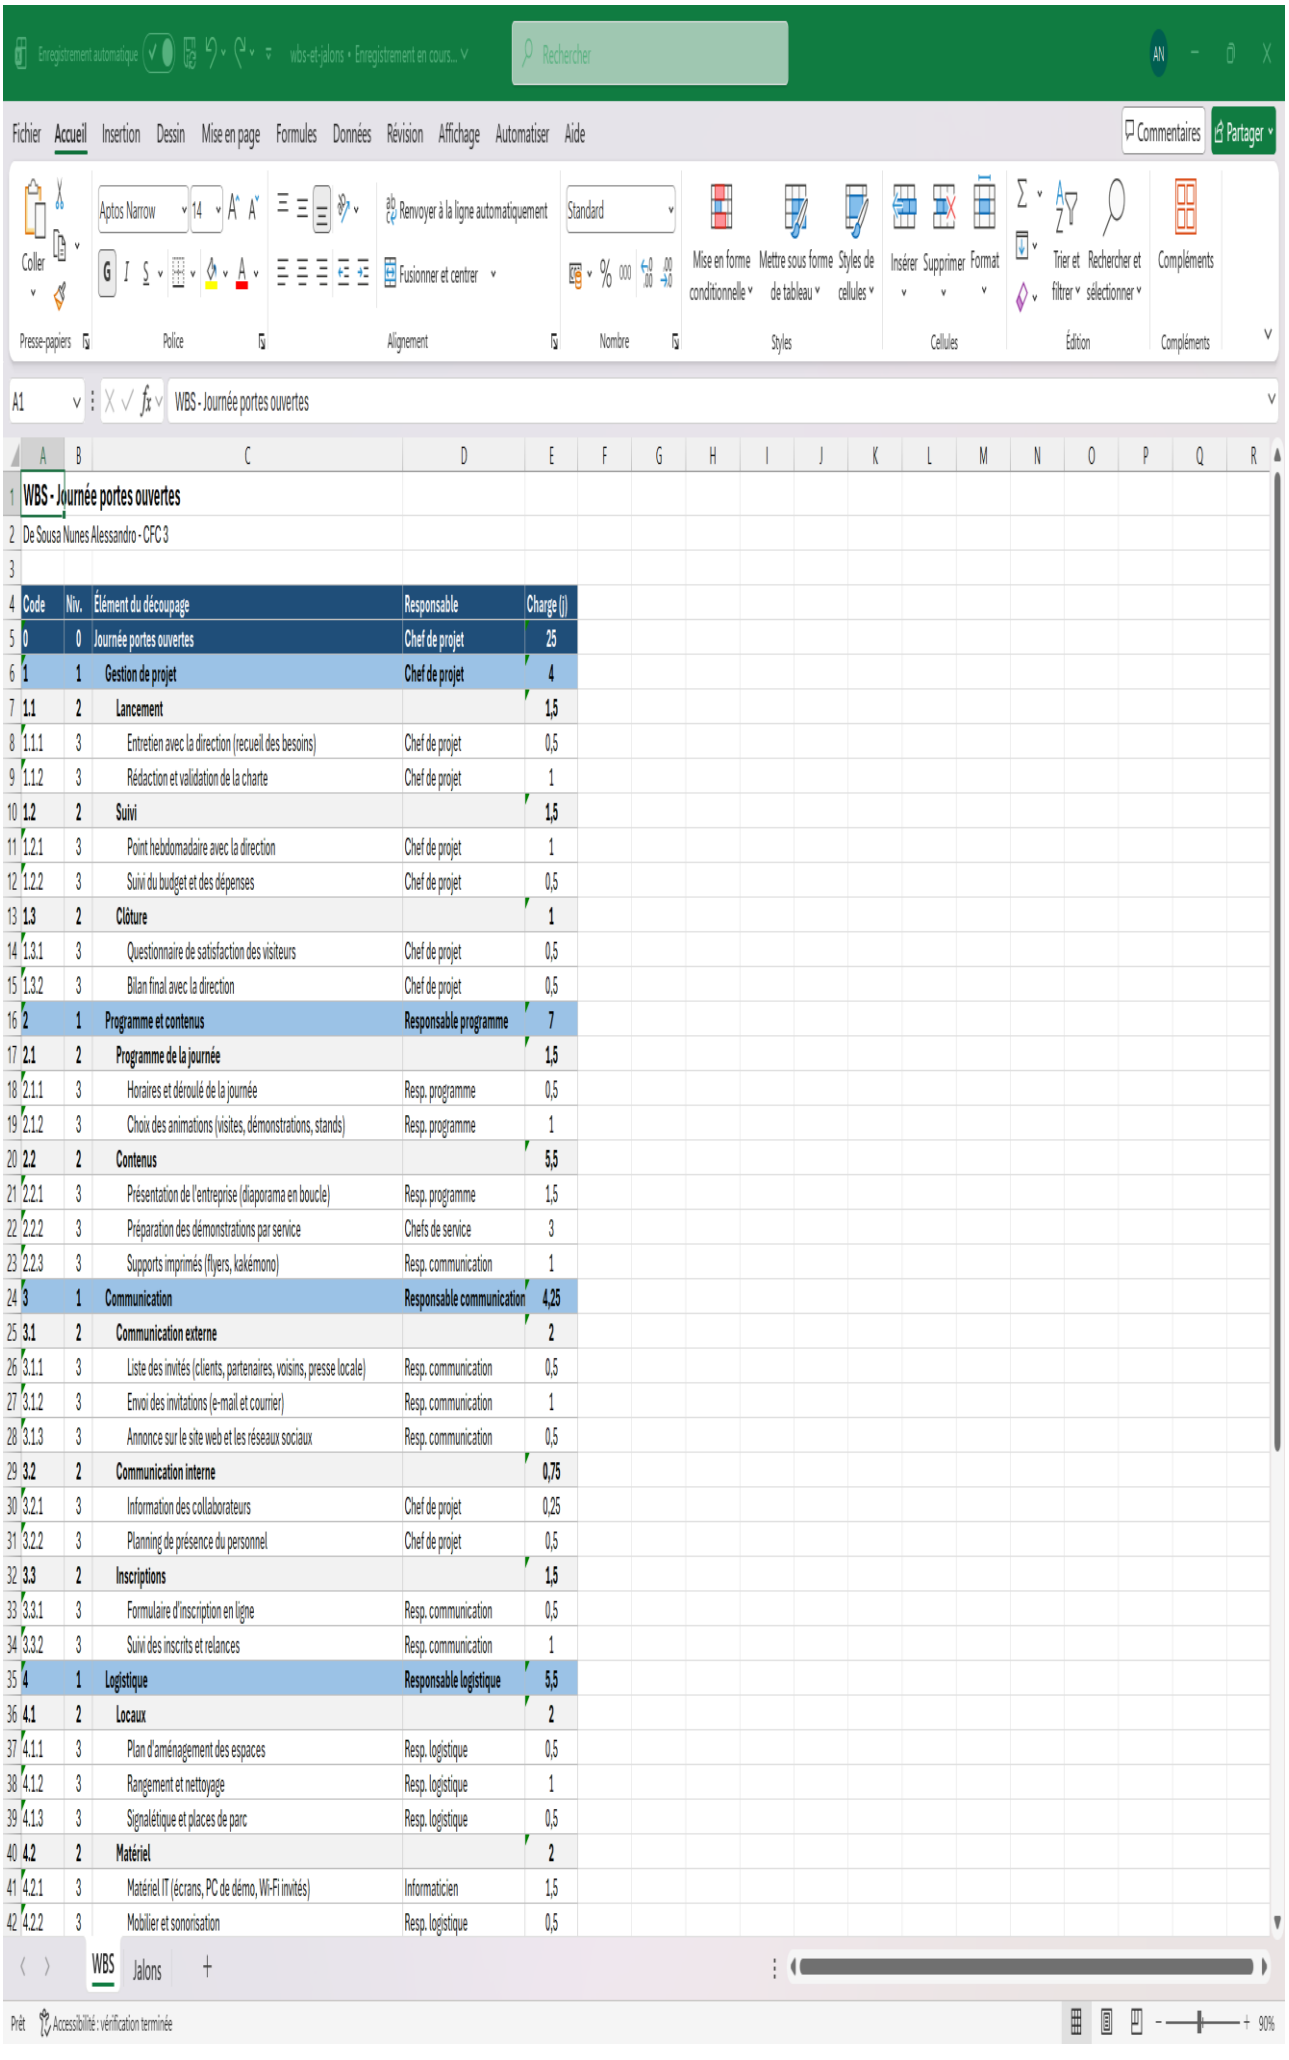

Enregistrement automatique wbs-et-jalons • Enregistrement en cours... Rechercher AN

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Commentaires Partager

Coller Aptos Narrow 14 Renvoyer à la ligne automatiquement Standard Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules Insérer Supprimer Format Trier et filtrer Rechercher et sélectionner Compléments

Presse-papiers Police Alignement Nombre Styles Cellules Édition Compléments

A1 WBS - Journée portes ouvertes


WBS - Journée portes ouvertes

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Code	Niv.	Élément du découpage	Responsable	Charge (j)
0	**0**	**Journée portes ouvertes**	**Chef de projet**	**25**
1	**1**	**Gestion de projet**	**Chef de projet**	**4**
1.1	**2**	**Lancement**		**1,5**
1.1.1	3	Entretien avec la direction (recueil des besoins)	Chef de projet	0,5
1.1.2	3	Rédaction et validation de la charte	Chef de projet	1
1.2	**2**	**Suivi**		**1,5**
1.2.1	3	Point hebdomadaire avec la direction	Chef de projet	1
1.2.2	3	Suivi du budget et des dépenses	Chef de projet	0,5
1.3	**2**	**Clôture**		**1**
1.3.1	3	Questionnaire de satisfaction des visiteurs	Chef de projet	0,5
1.3.2	3	Bilan final avec la direction	Chef de projet	0,5
2	**1**	**Programme et contenus**	**Responsable programme**	**7**
2.1	**2**	**Programme de la journée**		**1,5**
2.1.1	3	Horaires et déroulé de la journée	Resp. programme	0,5
2.1.2	3	Choix des animations (visites, démonstrations, stands)	Resp. programme	1
2.2	**2**	**Contenus**		**5,5**
2.2.1	3	Présentation de l'entreprise (diaporama en boucle)	Resp. programme	1,5
2.2.2	3	Préparation des démonstrations par service	Chefs de service	3
2.2.3	3	Supports imprimés (flyers, kakémono)	Resp. communication	1
3	**1**	**Communication**	**Responsable communication**	**4,25**
3.1	**2**	**Communication externe**		**2**
3.1.1	3	Liste des invités (clients, partenaires, voisins, presse locale)	Resp. communication	0,5
3.1.2	3	Envoi des invitations (e-mail et courrier)	Resp. communication	1
3.1.3	3	Annonce sur le site web et les réseaux sociaux	Resp. communication	0,5
3.2	**2**	**Communication interne**		**0,75**
3.2.1	3	Information des collaborateurs	Chef de projet	0,25
3.2.2	3	Planning de présence du personnel	Chef de projet	0,5
3.3	**2**	**Inscriptions**		**1,5**
3.3.1	3	Formulaire d'inscription en ligne	Resp. communication	0,5
3.3.2	3	Suivi des inscrits et relances	Resp. communication	1
4	**1**	**Logistique**	**Responsable logistique**	**5,5**
4.1	**2**	**Locaux**		**2**
4.1.1	3	Plan d'aménagement des espaces	Resp. logistique	0,5
4.1.2	3	Rangement et nettoyage	Resp. logistique	1
4.1.3	3	Signalétique et places de parc	Resp. logistique	0,5
4.2	**2**	**Matériel**		**2**
4.2.1	3	Matériel IT (écrans, PC de démo, Wi-Fi invités)	Informaticien	1,5
4.2.2	3	Mobilier et sonorisation	Resp. logistique	0,5

WBS Jalons +

Prêt Accessibilité : vérification terminée 90%

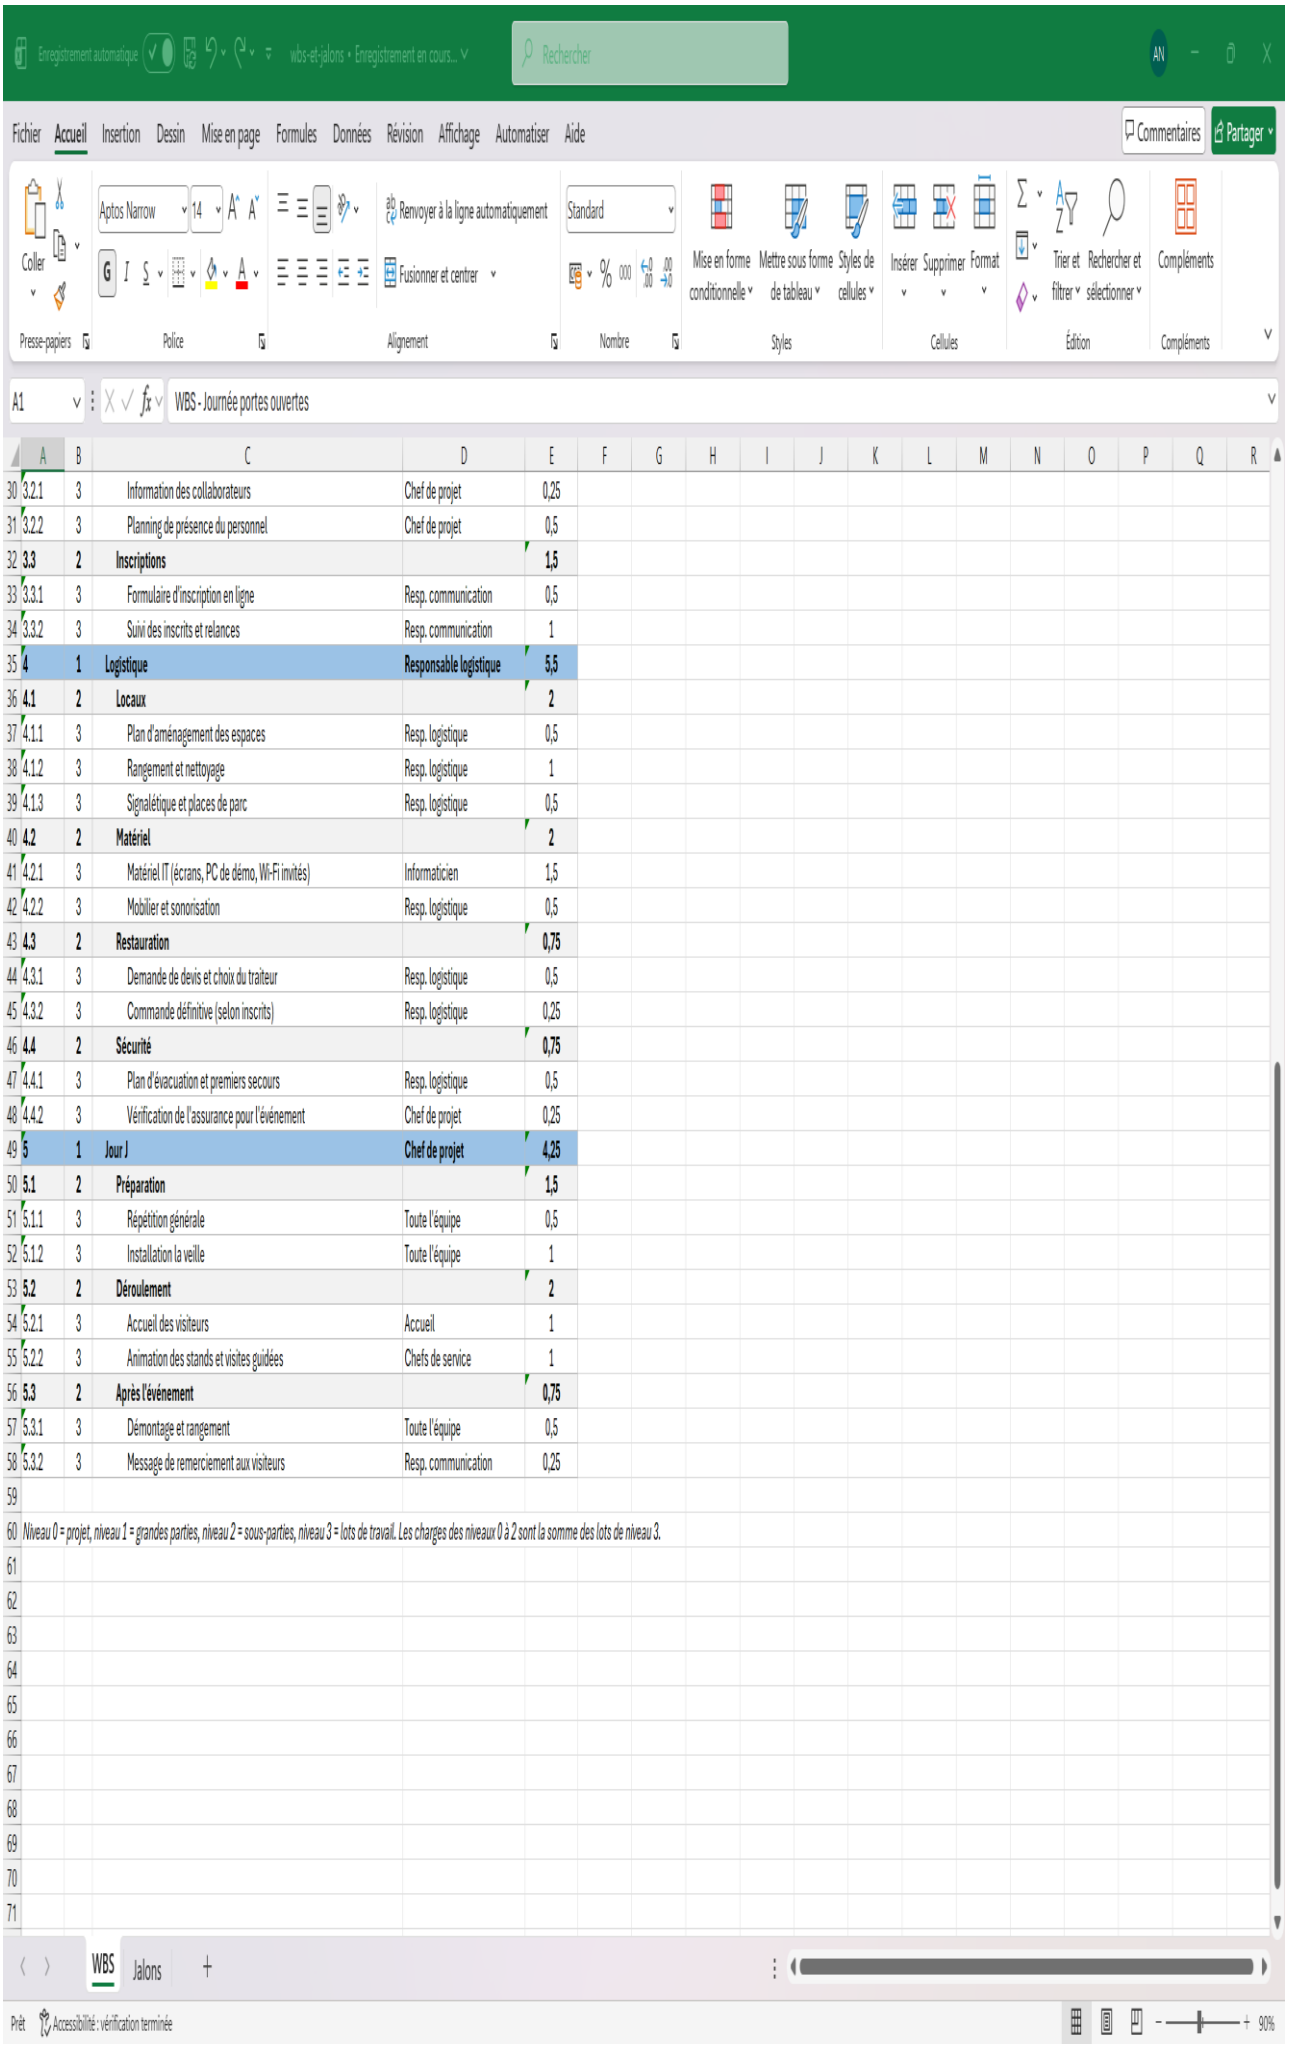

Enregistrement automatique wbs-et-jalons • Enregistrement en cours... Rechercher AN

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Commentaires Partager

Coller Aptos Narrow 14 Renvoyer à la ligne automatiquement Standard Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules Insérer Supprimer Format Trier et filtrer Rechercher et sélectionner Compléments

Presse-papiers Police Alignement Nombre Styles Cellules Édition Compléments

A1 WBS - Journée portes ouvertes


	A	B	C	D	E
30	3.2.1	3	Information des collaborateurs	Chef de projet	0,25
31	3.2.2	3	Planning de présence du personnel	Chef de projet	0,5
32	**3.3**	**2**	**Inscriptions**		**1,5**
33	3.3.1	3	Formulaire d'inscription en ligne	Resp. communication	0,5
34	3.3.2	3	Suivi des inscrits et relances	Resp. communication	1
35	**4**	**1**	**Logistique**	**Responsable logistique**	**5,5**
36	**4.1**	**2**	**Locaux**		**2**
37	4.1.1	3	Plan d'aménagement des espaces	Resp. logistique	0,5
38	4.1.2	3	Rangement et nettoyage	Resp. logistique	1
39	4.1.3	3	Signalétique et places de parc	Resp. logistique	0,5
40	**4.2**	**2**	**Matériel**		**2**
41	4.2.1	3	Matériel IT (écrans, PC de démo, Wi-Fi invités)	Informaticien	1,5
42	4.2.2	3	Mobilier et sonorisation	Resp. logistique	0,5
43	**4.3**	**2**	**Restauration**		**0,75**
44	4.3.1	3	Demande de devis et choix du traiteur	Resp. logistique	0,5
45	4.3.2	3	Commande définitive (selon inscrits)	Resp. logistique	0,25
46	**4.4**	**2**	**Sécurité**		**0,75**
47	4.4.1	3	Plan d'évacuation et premiers secours	Resp. logistique	0,5
48	4.4.2	3	Vérification de l'assurance pour l'événement	Chef de projet	0,25
49	**5**	**1**	**Jour J**	**Chef de projet**	**4,25**
50	**5.1**	**2**	**Préparation**		**1,5**
51	5.1.1	3	Répétition générale	Toute l'équipe	0,5
52	5.1.2	3	Installation la veille	Toute l'équipe	1
53	**5.2**	**2**	**Déroulement**		**2**
54	5.2.1	3	Accueil des visiteurs	Accueil	1
55	5.2.2	3	Animation des stands et visites guidées	Chefs de service	1
56	**5.3**	**2**	**Après l'événement**		**0,75**
57	5.3.1	3	Démontage et rangement	Toute l'équipe	0,5
58	5.3.2	3	Message de remerciement aux visiteurs	Resp. communication	0,25
59					
60	*Niveau 0 = projet, niveau 1 = grandes parties, niveau 2 = sous-parties, niveau 3 = lots de travail. Les charges des niveaux 0 à 2 sont la somme des lots de niveau 3.*				

WBS Jalons +

Prêt Accessibilité : vérification terminée 90%

9. Jalons

Jalon	Description	Date	Pourquoi ce jalon
J0	Lancement du projet	19.10.2026	Début officiel, entretien avec la direction.
J1	Charte validée par la direction	23.10.2026	Rien n'est engagé avant que les objectifs et le budget soient validés.
J2	Programme et budget validés	30.10.2026	Nécessaire pour rédiger les invitations.
J3	Invitations envoyées	06.11.2026	3 semaines avant le jour J, pour laisser le temps aux invités de s'organiser.
J4	Logistique confirmée	13.11.2026	Le traiteur demande en général une confirmation environ 2 semaines avant.
J5	Répétition générale	25.11.2026	Test du parcours et du matériel 2 jours avant, avec le temps de corriger.
J6	Jour J : portes ouvertes	27.11.2026	Fin de la semaine 6.
J7	Bilan de clôture	04.12.2026	Analyse du questionnaire et des dépenses une semaine après.

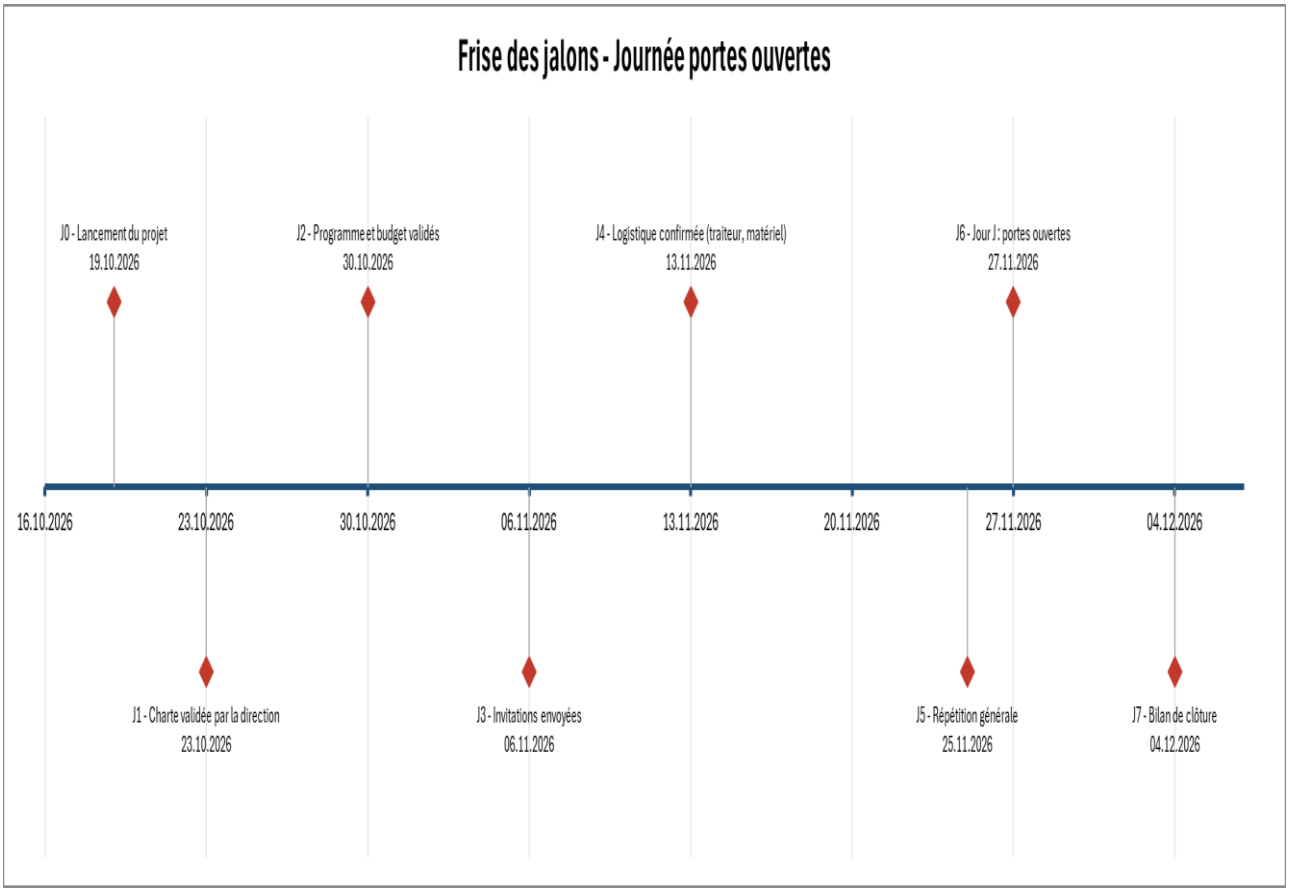

10. Vérification avant présentation

Point contrôlé	Résultat

Chaque objectif est mesurable (chiffre ou date)	OK
Le WBS a au moins 3 niveaux sous le projet	OK – 3 niveaux (parties, sous-parties, lots de travail)
Chaque élément du périmètre « inclus » se retrouve dans le WBS	OK – programme (2), invitations et inscriptions (3), locaux et matériel (4.1, 4.2), traiteur (4.3), questionnaire et bilan (1.3)
Aucun élément « exclu » n'apparaît dans le WBS	OK
Chaque lot de niveau 3 a un responsable	OK
La somme des charges des parties = charge totale	4 + 7 + 4.25 + 5.5 + 4.25 = 25 j – OK
Les jalons sont dans l'ordre logique et le jour J tombe en semaine 6	OK – 27.11.2026

11. Validation par le commanditaire

La charte et le découpage doivent être présentés au formateur (commanditaire) pour validation. Le formateur étant absent, la présentation n'a pas pu avoir lieu : à la place, j'ai fait l'auto-contrôle de la section 10 point par point. Le tableau ci-dessous reste à remplir lors de la présentation.

Décision	Remarques	Date	Signature
☐ Validé ☐ À corriger			
