Registre des risques - Migration de la messagerie vers une solution cloud


De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

ID	Risque	Catégorie	Cause	Conséquence	Proba. (1-5)	Impact (1-5)	Score	Niveau	Rang	Stratégie	Mesure préventive	Responsable
R1	Perte ou corruption de courriels pendant la migration des boîtes	Technique	Boîtes volumineuses, coupure pendant le transfert, outil de migration mal paramétré	Perte d'historique client, problème légal (conservation des pièces 10 ans)	3	5	15	Critique	1	Réduire	Sauvegarde complète avant migration, migration pilote sur 3 boîtes, contrôle du nombre d'éléments avant/après	Admin système
R2	Messagerie indisponible le jour du basculement	Technique	Basculement des enregistrements DNS (MX), synchronisation incomplète	Courriels clients non reçus, activité bloquée	3	4	12	Critique	2	Réduire	Basculement un vendredi soir, TTL DNS abaissé 48 h avant, plan de retour arrière	Admin système
R3	Utilisateurs perdus avec le nouvel outil (résistance au changement)	Humain	Changement d'interface, pas de formation, habitudes	Baisse de productivité, nombreux appels au support, rejet du projet	4	3	12	Critique	3	Réduire	Communication dès le lancement, formation courte, guide d'une page, référents par service	Chef de projet
R4	Dépassement du budget (licences, prestations)	Organisationnel	Nombre de licences mal estimé, heures de support externe en plus	Budget dépassé, arbitrage de la direction	3	3	9	Élevé	5	Réduire	Inventaire exact des comptes, devis fermes, réserve de 10 %	Chef de projet
R5	Incompatibilité avec des appareils ou logiciels qui envoient des e-mails	Technique	Scanner, imprimante multifonction, logiciel métier utilisant l'ancien serveur SMTP	Envois automatiques bloqués (scans, factures)	3	3	9	Élevé	6	Réduire	Inventaire des appareils qui envoient des e-mails, tests avant le basculement	Admin système
R6	Mauvaise configuration de sécurité (SPF, DKIM, MFA)	Technique	Paramétrage incomplet du nouveau domaine	Courriels classés en spam, risque de phishing et d'usurpation	2	5	10	Élevé	4	Réduire	Checklist de sécurité, activation MFA, contrôle avec un outil de test DNS	Admin système
R7	Absence de la personne clé (admin système)	Humain	Maladie, vacances, départ	Projet bloqué ou retardé	2	3	6	Moyen	9	Réduire	Documentation des étapes, binôme avec un deuxième technicien	Chef de projet
R8	Mauvaise configuration DNS (MX) au basculement	Technique	Erreur de saisie, propagation DNS	Courriels rejetés ou perdus pendant plusieurs heures	2	4	8	Élevé	7	Réduire	Double contrôle des enregistrements, test d'envoi externe juste après la modification	Admin système
R9	Non-conformité à la protection des données (nLPD)	Organisationnel	Lieu d'hébergement des données non vérifié, pas d'analyse du contrat	Sanction, perte de confiance des clients	2	4	8	Élevé	8	Transférer / réduire	Choisir un hébergement en Suisse ou UE, faire valider le contrat par la direction	Direction
R10	Bande passante insuffisante pendant la synchronisation	Technique	Volume de données important, connexion partagée	Migration plus lente, internet ralenti pour les utilisateurs	3	2	6	Moyen	10	Accepter	Migration la nuit et le week-end, suivi du débit	Admin système

Score = probabilité x impact. Niveau : 12 et plus = critique, 8 à 11 = élevé, 4 à 7 = moyen, 1 à 3 = faible. En cas d'égalité de score, le risque avec le plus grand impact est classé avant.

Matrice probabilité / impact

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

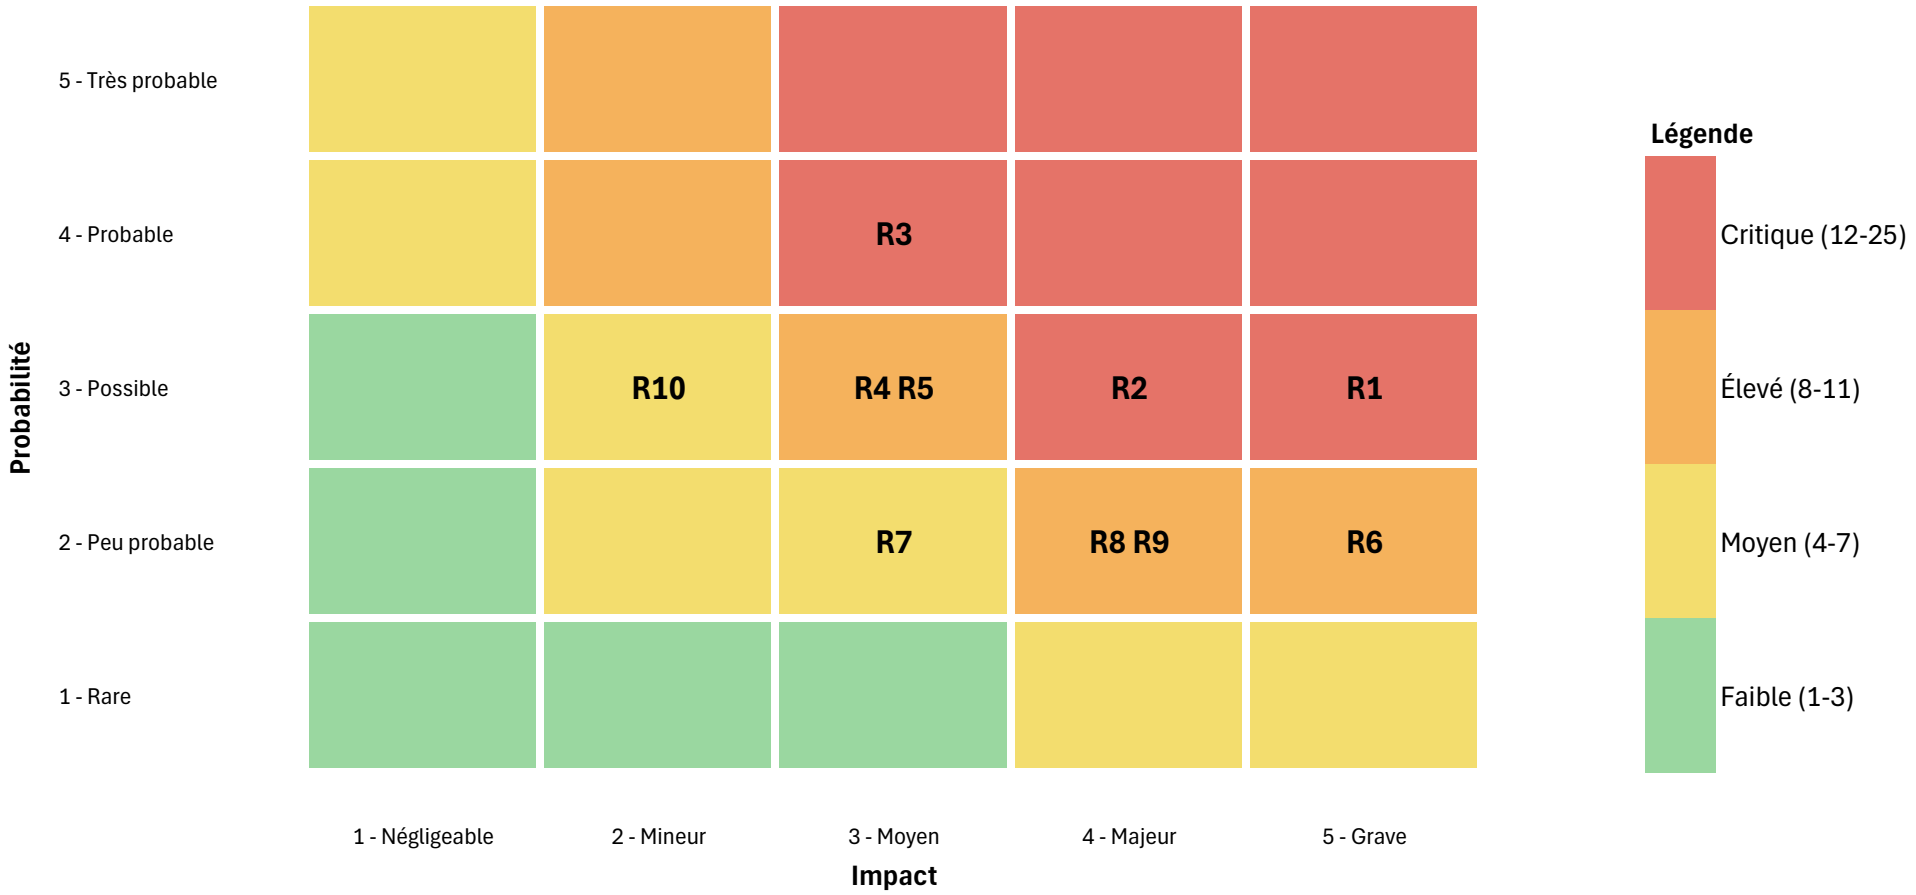

Les identifiants de chaque case sont calculés automatiquement à partir du registre (onglet Registre des risques).

Échelles d'évaluation utilisées

Note	Probabilité	Impact
1	Rare : moins de 10 % de chance	Négligeable : gêne mineure, aucun retard
2	Peu probable : 10 à 30 %	Mineur : retard de moins d'un jour, petit surcoût
3	Possible : 30 à 50 %	Moyen : retard de quelques jours ou gêne pour plusieurs utilisateurs
4	Probable : 50 à 80 %	Majeur : activité perturbée, retard d'une semaine, surcoût important
5	Très probable : plus de 80 %	Grave : perte de données, arrêt de l'activité ou problème légal
