Plan de projet initial

Mise en place d'un wiki interne de documentation

Projet	Projet 5 – Pilotage complet d'un mini-projet de bout en bout
Cours	306 – Techniques de gestion de projets
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3
Formateur référent	Morrad
Version / date	1.0 – octobre 2026

1. Contexte

L'entreprise (fictive) compte 25 collaborateurs. Sa documentation interne (procédures, modes d'emploi, informations pour les nouveaux collaborateurs) est éparpillée entre un partage réseau, des e-mails et des fichiers sur les postes. On perd du temps à chercher l'information, et les documents ne sont souvent plus à jour.

La direction veut un wiki interne, accessible depuis le navigateur, où tout le monde trouve la documentation au même endroit. Le projet est piloté pendant la semaine PPE (5 jours ouvrés) et suivi par un comité de pilotage.

2. Objectifs

Axe	Objectif	Comment on le mesure
Délai	Wiki en service à la fin du J5	Date de mise en service
Coût	Rester dans le budget de CHF 11'484 (réserve comprise)	Coût réel cumulé dans le tableau de bord
Qualité	Les 30 documents les plus utilisés sont repris et accessibles avec le compte de l'entreprise	Recette : liste des 30 documents contrôlée, test de connexion avec 3 comptes
Utilisation	Au moins 15 collaborateurs formés	Liste de présence aux formations

3. Périmètre

Inclus	Exclu
• Installation du wiki sur une machine virtuelle de l'entreprise • Connexion avec les comptes de l'entreprise • Droits d'accès (lecture pour tous, modification par les référents) • Reprise des 30 documents les plus utilisés • Formation et guide d'utilisation	• Reprise de tous les anciens documents (fait progressivement après le projet) • Accès depuis l'extérieur de l'entreprise • Développement de fonctions sur mesure

4. Équipe et organisation


Rôle	Qui	Charge prévue
Sponsor / président du comité de pilotage	Directeur (rôle tenu par le formateur)	2 séances de comité
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro	30 h
Administrateur système	Membre fictif de l'équipe	28 h
Développeur	Membre fictif de l'équipe	16 h
Référent métier	Membre fictif de l'équipe	24 h

Matrice RACI : elle précise qui réalise, qui approuve, qui est consulté et qui est informé pour chaque lot (onglet RACI du fichier Excel, avec un contrôle automatique d'un seul A par ligne).

Activité	Sponsor	Chef de projet	Admin système	Développeur	Référent métier	Utilisateurs	Contrôle (un seul A)
L1 - Cadrage et lancement	A	R	C	C	C	I	OK
L2 - Installation du serveur et du wiki		A	R	I			OK
L3 - Configuration (droits, comptes)		A	R	R	C		OK
L4 - Reprise des documents		A		R	R	C	OK
L5 - Tests et recette	I	A	R	R	R	C	OK
L6 - Formation	I	A	C		R	I	OK
L7 - Pilotage et reporting	A	R	I	I	I		OK
Décisions du comité (réserve, aléa)	A	R	C	C	C		OK
Mise en service et clôture	A	R	R	I	C	I	OK

Comité de pilotage : il se réunit le J2 et le J4 en fin de journée. Le chef de projet présente un rapport d'avancement (délai, coût, risques, décisions à prendre). La clôture est présentée le J5.

5. Planning

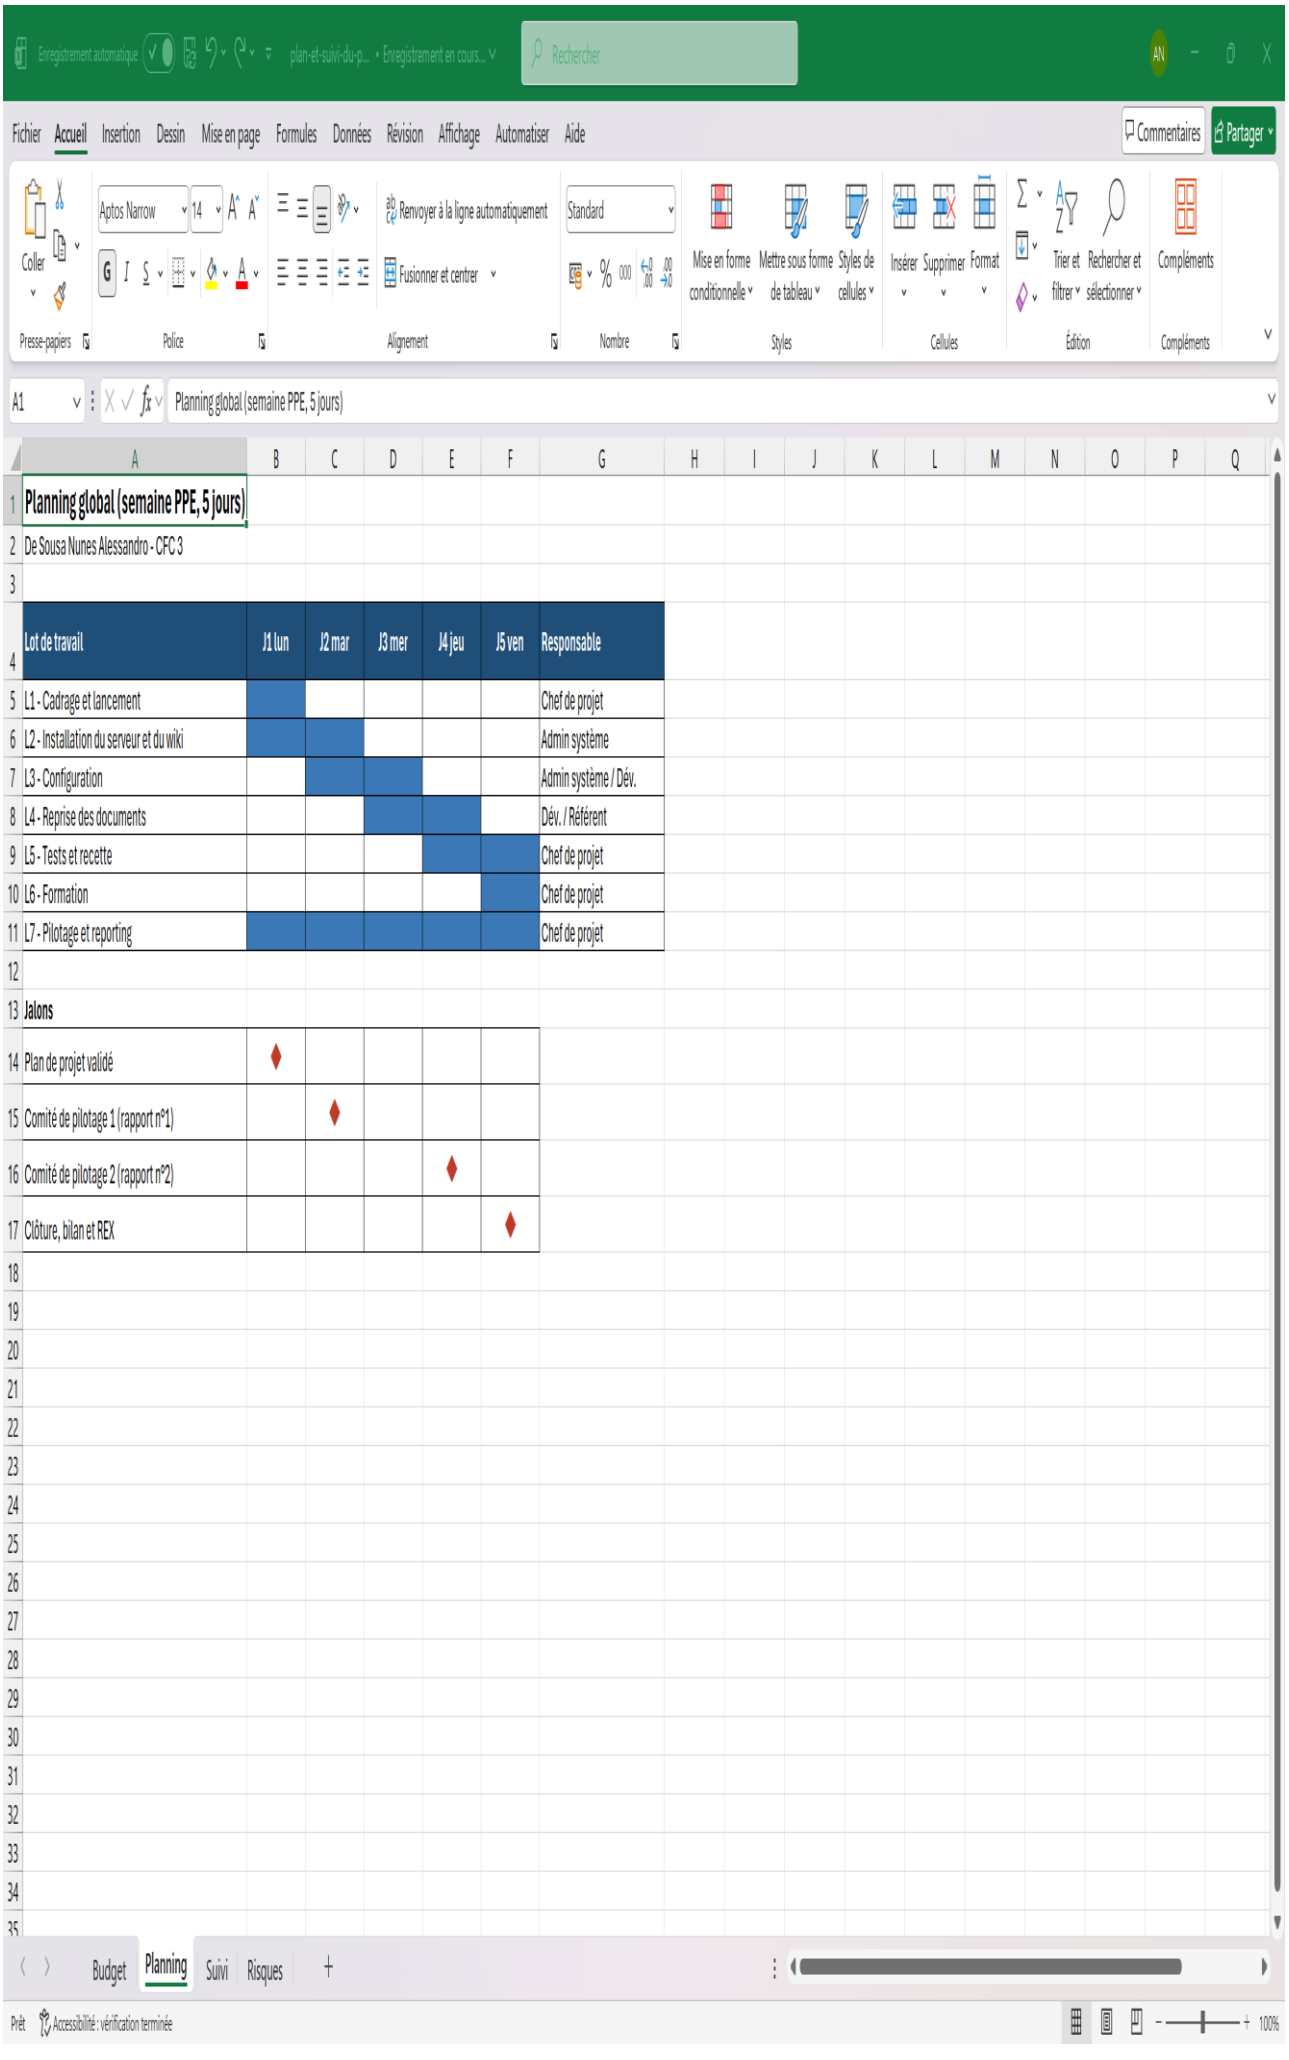

Enregistrement automatique plan-et-suivi-du-p... • Enregistrement en cours... Rechercher AN

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Commentaires Partager

Coller Aptos Narrow 14 Renvoyer à la ligne automatiquement Standard Fusionner et centrer Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules Insérer Supprimer Format Trier et filtrer Rechercher et sélectionner Compléments

Presse-papiers Police Alignement Nombre Styles Cellules Édition Compléments

A1 Planning global (semaine PPE, 5 jours)

Planning global (semaine PPE, 5 jours)

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Lot de travail	J1 lun	J2 mar	J3 mer	J4 jeu	J5 ven	Responsable
L1 - Cadrage et lancement	■					Chef de projet
L2 - Installation du serveur et du wiki	■	■				Admin système
L3 - Configuration		■	■			Admin système / Dév.
L4 - Reprise des documents			■	■		Dév. / Référent
L5 - Tests et recette				■	■	Chef de projet
L6 - Formation					■	Chef de projet
L7 - Pilotage et reporting	■	■	■	■	■	Chef de projet

Jalons

Plan de projet validé	♦				
Comité de pilotage 1 (rapport n°1)		♦			
Comité de pilotage 2 (rapport n°2)				♦	
Clôture, bilan et REX					♦


Budget Planning Suivi Risques +

Prêt Accessibilité : vérification terminée 100%

6. Budget prévisionnel

Le budget est calculé dans Excel (fichier *plan-et-suivi-du-projet.xlsx*, onglet Budget) : heures prévues × tarif horaire de chaque rôle, plus les autres coûts. Une réserve de 10 % est ajoutée pour les imprévus. Elle ne peut être utilisée qu'avec l'accord du comité de pilotage.

Poste	Montant (CHF)
Main-d'oeuvre (98 heures)	9'940
Machine virtuelle et nom de domaine (1re année)	500
Sous-total	**10'440**
Réserve pour imprévus (10 %)	1'044
Budget total	**11'484**

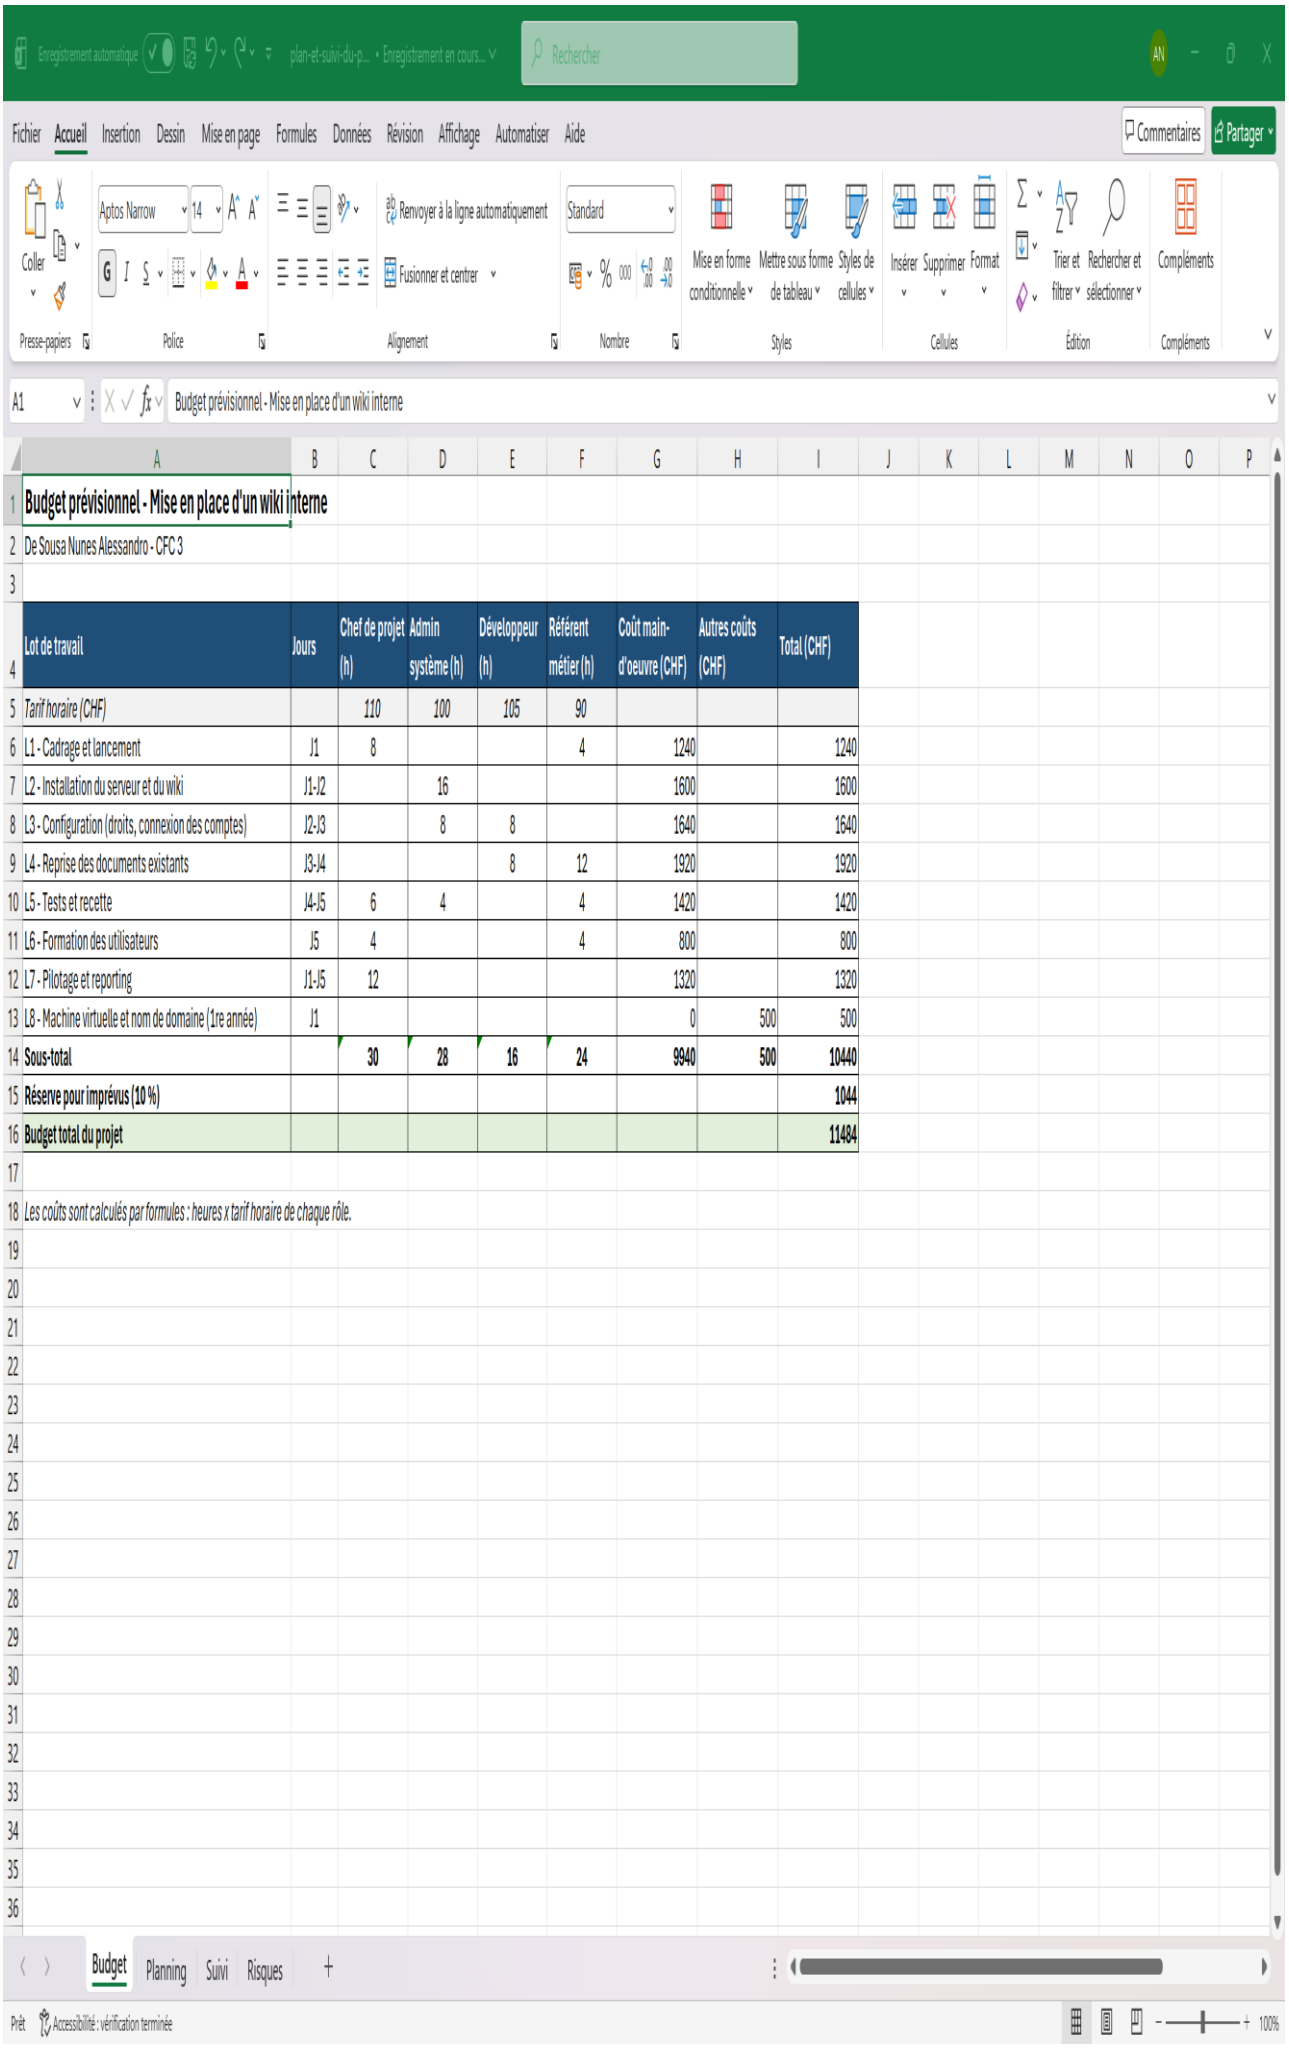

Enregistrement automatique plan-et-suivi-du-p... • Enregistrement en cours... Rechercher AN

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Commentaires Partager

Coller Aptos Narrow 14 Renvoyer à la ligne automatiquement Standard Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules Insérer Supprimer Format Trier et filtrer Rechercher et sélectionner Compléments

Presse-papiers Police Alignement Nombre Styles Cellules Édition Compléments

A1 Budget prévisionnel - Mise en place d'un wiki interne

Budget prévisionnel - Mise en place d'un wiki interne

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Lot de travail	Jours	Chef de projet (h)	Admin système (h)	Développeur (h)	Référent métier (h)	Coût main-d'oeuvre (CHF)	Autres coûts (CHF)	Total (CHF)
Tarif horaire (CHF)		*110*	*100*	*105*	*90*			
L1 - Cadrage et lancement	J1	8			4	1240		1240
L2 - Installation du serveur et du wiki	J1-J2		16			1600		1600
L3 - Configuration (droits, connexion des comptes)	J2-J3		8	8		1640		1640
L4 - Reprise des documents existants	J3-J4			8	12	1920		1920
L5 - Tests et recette	J4-J5	6	4		4	1420		1420
L6 - Formation des utilisateurs	J5	4			4	800		800
L7 - Pilotage et reporting	J1-J5	12				1320		1320
L8 - Machine virtuelle et nom de domaine (1re année)	J1					0	500	500
Sous-total		**30**	**28**	**16**	**24**	**9940**	**500**	**10440**
Réserve pour imprévus (10 %)								**1044**
Budget total du projet								**11484**

Les coûts sont calculés par formules : heures x tarif horaire de chaque rôle.

Budget Planning Suivi Risques +

Prêt Accessibilité : vérification terminée 100%

7. Risques

ID	Risque	Score	Mesure prévue
R2	Documents existants mal organisés, reprise plus longue que prévu	12	Reprendre d'abord les documents les plus utilisés
R3	Référent métier peu disponible	9	Réserver ses créneaux dès le J1
R1	La machine virtuelle n'est pas prête le J1	8	Demande faite avant la semaine, solution de secours
R4	Problème de connexion avec les comptes de l'entreprise	6	Test dès le J2, connexion locale en secours
R5	Peu de participants à la formation	4	Formation courte et guide d'une page

8. Suivi et indicateurs

Chaque soir, je note dans le tableau de bord (onglet Suivi) le coût réel de la journée et l'avancement réel. L'écart avec le prévu et le statut se calculent automatiquement :

- **Coût :** coût réel cumulé comparé au coût prévu cumulé. Si l'écart dépasse la réserve (CHF 1'044), une alerte s'affiche et le comité doit décider.
- **Délai :** avancement réel comparé à l'avancement prévu (27 % le J1, 45 % le J2, 64 % le J3, 83 % le J4, 100 % le J5).
- **Risques :** relecture du registre à chaque comité.


Tableau de bord - suivi des coûts et de l'avancement

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Jour	Coût prévu du jour	Coût prévu cumulé	Avancement prévu	Coût réel du jour	Coût réel cumulé	Avancement réel	Écart de coût cumulé	Statut
J1 lun	2804	2804	27%	2849	2849	27%	45	Dépassement (dans la réserve)
J2 mar	1884	4688	45%	1884	4733	45%	45	Dépassement (dans la réserve)
J3 mer	2044	6732	64%	2064	6797	58%	65	Dépassement (dans la réserve)
J4 jeu	1934	8666	83%	2334	9131	80%	465	Dépassement (dans la réserve)
J5 ven	1774	10440	100%	1774	10905	100%	465	Dépassement (dans la réserve)
Total	**10440**			**10905**				
Budget total (avec réserve)	**11484**							

Les cellules jaunes (coût réel et avancement réel) sont remplies chaque soir pendant la semaine PPE. Le cumul, l'écart et le statut se calculent automatiquement.

SIMULATION : formateur absent, les valeurs réelles (cellules jaunes) sont un cas plausible choisi par le chef de projet. Aléa simulé : administrateur système malade le J3.

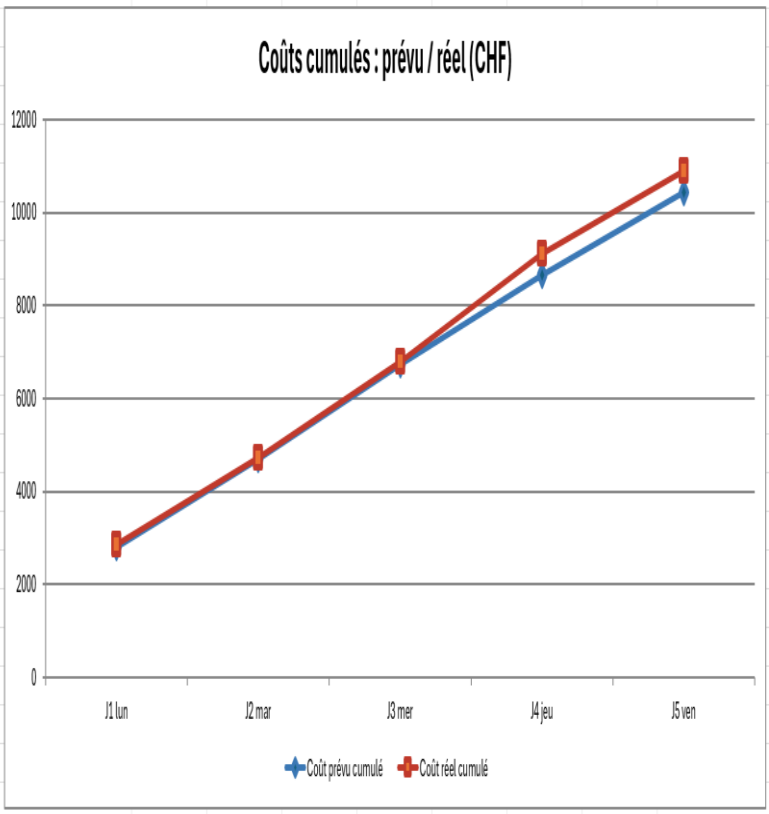

9. Gestion des imprévus

Pendant la semaine, le formateur va injecter un aléa. Pour le traiter, j'utiliserai la fiche « Gestion de l'aléa » : description de l'aléa, analyse de l'impact sur le délai, le coût et la qualité, options possibles, décision du comité de pilotage, et mise à jour du planning et du budget.

10. Validation du plan

Rôle	Nom	Date	Signature
Sponsor			
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro		
