Simulation – formateur absent. Ce bilan s'appuie sur le déroulement simulé de la semaine (chiffres du tableau de bord Excel et aléa choisi par le chef de projet). Le retour d'expérience porte aussi sur ce que j'ai appris en préparant et en pilotant ce projet.

Bilan de clôture et retour d'expérience (REX)

Projet	Mise en place d'un wiki interne
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3
Date de clôture	J5 (vendredi), fin de journée


1. Résultats par rapport aux objectifs

Objectif	Prévu	Réalisé (simulé)	Atteint ?
Délai	Wiki en service à la fin du J5	Mis en service le J5 à 16h	Oui
Coût	CHF 10'440 (+ réserve de 1'044)	CHF 10'905, soit +465 (+4,5 %), pris sur la réserve	Oui, dans le budget total de 11'484
Qualité	30 documents repris, connexion avec les comptes de l'entreprise	30 documents sur 30, connexion testée avec 3 comptes, recette sans défaut bloquant (2 corrections mineures de mise en page)	Oui
Utilisation	15 collaborateurs formés	17 collaborateurs formés en 2 sessions de 30 minutes	Oui

2. Bilan financier

Poste	Prévu (CHF)	Réel (CHF)	Écart
Main-d'oeuvre	9'940	10'405	+465
Autres coûts (VM, domaine)	500	500	0
Total	**10'440**	**10'905**	**+465**
Réserve utilisée	0	465 sur 1'044 (45 %)	–

Détail de l'écart : +45 le J1 (réunion de lancement plus longue), +420 dû à l'aléa du J3 (heures supplémentaires du développeur et de l'administrateur, moins les heures non travaillées par l'administrateur).

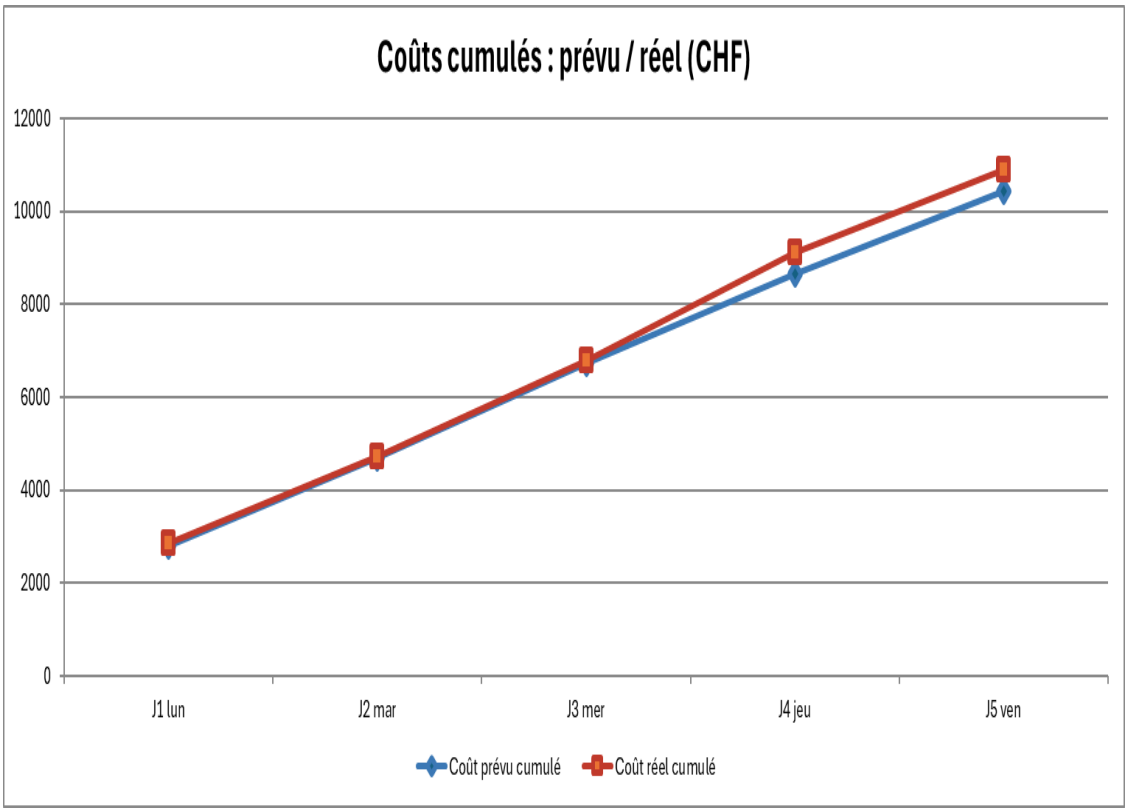

3. Gestion de l'aléa

Aléa	Administrateur système malade le J3
Décision prise	Option B : le développeur reprend les droits d'accès, l'administrateur termine la connexion des comptes le J4 matin
Effet réel sur le projet	Une demi-journée de retard sur les tests, rattrapée le J5 matin. Surcoût de CHF 420. Date de fin et qualité respectées.
Avec le recul, était-ce la bonne décision ?	Oui. L'option A aurait fait dépasser la semaine et la réserve, l'option C aurait dégradé la qualité. Le seul point faible : le J5 a été très chargé (recette et formation le même jour), sans plus aucune marge.

4. Livrables remis

Livrable	Remis à	Date
Wiki en service	Tous les collaborateurs	J5
Guide d'utilisation (1 page)	Tous les collaborateurs	J5
Documentation d'exploitation (installation, sauvegarde)	Administrateur système	J5

5. Retour d'expérience

Ce qui a bien fonctionné	Ce qui a posé problème	Ce que je ferais autrement
• Le tableau de bord Excel : l'écart et le statut se	• Une seule personne savait faire la	• Ajouter au registre le risque « absence d'une

calculent tout seuls, je voyais tout de suite si on dérivait. • La réserve de 10 % : sans elle, l'aléa aurait demandé une décision de budget en urgence. • Avoir limité la reprise aux 30 documents les plus utilisés : le lot L4 a été tenu.	configuration (l'administrateur) : dépendance forte à une personne, alors que ce risque n'était pas dans mon registre. • Le planning n'avait aucune marge le J5, donc le moindre retard tombait sur la recette et la formation.	personne clé » et prévoir un binôme dès le départ. • Garder une demi-journée de marge avant la mise en service. • Préparer à l'avance des options de repli pour les lots critiques, pour décider plus vite.

Ce que j'ai appris

Le plus important pour moi : un bon suivi ne sert pas seulement à constater les problèmes, il sert à décider vite. Comme le tableau de bord et la réserve étaient prêts, j'ai pu analyser l'aléa et proposer une solution en moins d'une heure. J'ai aussi vu que les estimations de charge étaient correctes pour les lots techniques. Ce qui a coûté le plus, c'est l'humain (réunion qui déborde, absence imprévue), et c'est là que je mettrai plus de marge la prochaine fois.

6. Suite du projet

Point ouvert	Responsable après le projet
Reprise des autres documents (au-delà des 30 premiers)	Référent métier, avec un document par service et par semaine
Former un deuxième administrateur du wiki	Administrateur système

7. Clôture

Rôle	Nom	Date	Signature
Sponsor (formateur)			
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro		
