Budget prévisionnel - Mise en place d'un wiki interne

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Lot de travail	Jours	Chef de projet (h)	Admin système (h)	Développeur (h)	Référent métier (h)	Coût main-d'oeuvre (CHF)	Autres coûts (CHF)	Total (CHF)
Tarif horaire (CHF)		*110*	*100*	*105*	*90*			
L1 - Cadrage et lancement	J1	8			4	1240		1240
L2 - Installation du serveur et du wiki	J1-J2		16			1600		1600
L3 - Configuration (droits, connexion des comptes)	J2-J3		8	8		1640		1640
L4 - Reprise des documents existants	J3-J4			8	12	1920		1920
L5 - Tests et recette	J4-J5	6	4		4	1420		1420
L6 - Formation des utilisateurs	J5	4			4	800		800
L7 - Pilotage et reporting	J1-J5	12				1320		1320
L8 - Machine virtuelle et nom de domaine (1re année)	J1					0	500	500
Sous-total		**30**	**28**	**16**	**24**	**9940**	**500**	**10440**
Réserve pour imprévus (10 %)								**1044**
Budget total du projet								**11484**

Les coûts sont calculés par formules : heures x tarif horaire de chaque rôle.

Planning global (semaine PPE, 5 jours)

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Lot de travail	J1 lun	J2 mar	J3 mer	J4 jeu	J5 ven	Responsable
L1 - Cadrage et lancement	■					Chef de projet
L2 - Installation du serveur et du wiki	■	■				Admin système
L3 - Configuration		■	■			Admin système / Dév.
L4 - Reprise des documents			■	■		Dév. / Référent
L5 - Tests et recette				■	■	Chef de projet
L6 - Formation					■	Chef de projet
L7 - Pilotage et reporting	■	■	■	■	■	Chef de projet

Jalons

Plan de projet validé	◆				
Comité de pilotage 1 (rapport n°1)		◆			
Comité de pilotage 2 (rapport n°2)				◆	
Clôture, bilan et REX					◆


Tableau de bord - suivi des coûts et de l'avancement

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Jour	Coût prévu du jour	Coût prévu cumulé	Avancement prévu	Coût réel du jour	Coût réel cumulé	Avancement réel	Écart de coût cumulé	Statut
J1 lun	2804	2804	27%	2849	2849	27%	45	Dépassement (dans la réserve)
J2 mar	1884	4688	45%	1884	4733	45%	45	Dépassement (dans la réserve)
J3 mer	2044	6732	64%	2064	6797	58%	65	Dépassement (dans la réserve)
J4 jeu	1934	8666	83%	2334	9131	80%	465	Dépassement (dans la réserve)
J5 ven	1774	10440	100%	1774	10905	100%	465	Dépassement (dans la réserve)
Total	**10440**			**10905**				
Budget total (avec réserve)	**11484**							

Les cellules jaunes (coût réel et avancement réel) sont remplies chaque soir pendant la semaine PPE. Le cumul, l'écart et le statut se calculent automatiquement.

SIMULATION : formateur absent, les valeurs réelles (cellules jaunes) sont un cas plausible choisi par le chef de projet. Aléa simulé : administrateur système malade le J3.

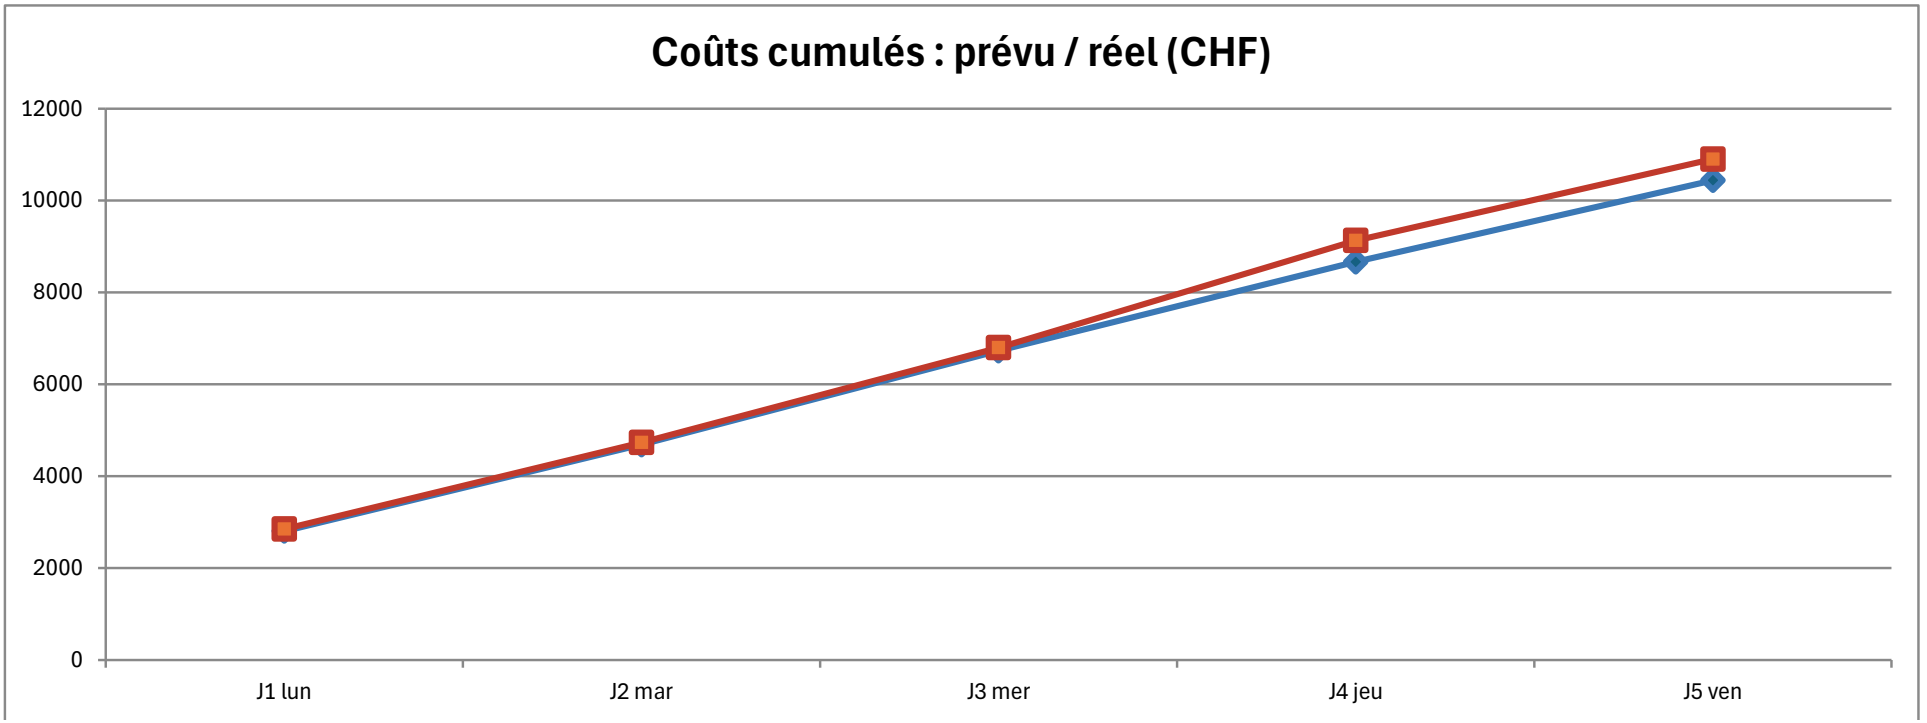


Coût prévu cumulé
Coût réel cumulé

Principaux risques du projet

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

ID	Risque	Proba. (1-5)	Impact (1-5)	Score	Mesure prévue	Responsable
R1	La machine virtuelle n'est pas prête le J1	2	4	8	Demande faite avant la semaine, solution de secours sur un PC de test	Admin système
R2	Documents existants mal organisés, reprise plus longue que prévu	4	3	12	Reprendre d'abord les documents les plus utilisés, le reste après le projet	Référent métier
R3	Référent métier peu disponible	3	3	9	Réserver ses créneaux dès le J1 avec son responsable	Chef de projet
R4	Problème de connexion avec les comptes de l'entreprise	2	3	6	Test de connexion dès le J2, connexion locale en solution de secours	Développeur
R5	Peu de participants à la formation	2	2	4	Formation courte (30 min) et guide d'une page	Chef de projet

Matrice RACI - Mise en place du wiki interne

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Activité	Sponsor	Chef de projet	Admin système	Développeur	Référent métier	Utilisateurs	Contrôle (un seul A)
L1 - Cadrage et lancement	A	R	C	C	C	I	OK
L2 - Installation du serveur et du wiki		A	R	I			OK
L3 - Configuration (droits, comptes)		A	R	R	C		OK
L4 - Reprise des documents		A		R	R	C	OK
L5 - Tests et recette	I	A	R	R	R	C	OK
L6 - Formation	I	A	C		R	I	OK
L7 - Pilotage et reporting	A	R	I	I	I		OK
Décisions du comité (réserve, aléa)	A	R	C	C	C		OK
Mise en service et clôture	A	R	R	I	C	I	OK

R = Réalise le travail | A = Approuve, rend des comptes (un seul par activité) | C = Consulté avant | I = Informé après
