Techniques de gestion de projets

Rendu de la semaine PPE - les 5 projets du cours 306

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3
Formateur référent : Morrad
Octobre 2026

Ma démarche


- La consigne demandait de choisir un projet. J'ai réalisé les 5, car je les trouvais trop courts pour une semaine de PPE.
- Chaque projet est fait dans les outils qu'on utilise en entreprise : Excel (calculs, planning, suivi), Word (documents), PowerPoint (schémas).
- Les calculs (dates, marges, coûts, scores) sont faits par formules : si une donnée change, tout se met à jour.
- Tout le rendu est versionné dans un dépôt GitHub privé.

Formateur absent : parties simulées


- Projet 1 : réponses à l'entretien de recueil des besoins
- Projet 3 : choix du scénario de risques
- Projet 4 : sprint simulé (demandé par la consigne)
- Projet 5 : chiffres de la semaine, aléa et comité de pilotage
- Toujours signalé dans les documents. Aucune validation du formateur n'a été inventée.

Charte : journée portes ouvertes

- PME de 20 personnes, événement dans 6 semaines.
- Objectifs mesurables : 80 visiteurs, une démo par service, 70 % de satisfaits, budget de CHF 5'000.
- Périmètre clair : ce qui est inclus et ce qui est exclu (salle externe, publicité payante...).
- 6 parties prenantes avec leur rôle et leurs attentes.
- 8 jalons, du lancement (19.10) au bilan (04.12).

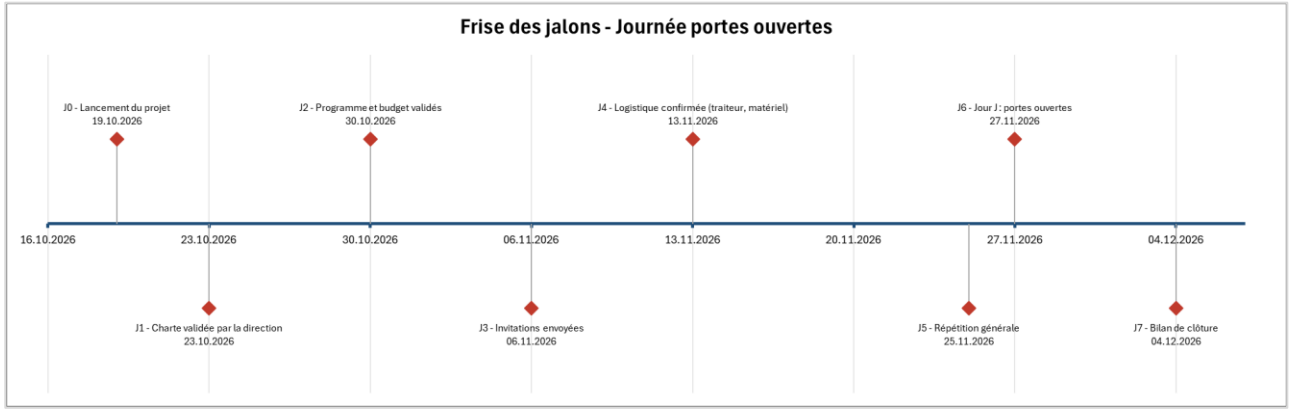


Découpage du projet (WBS)

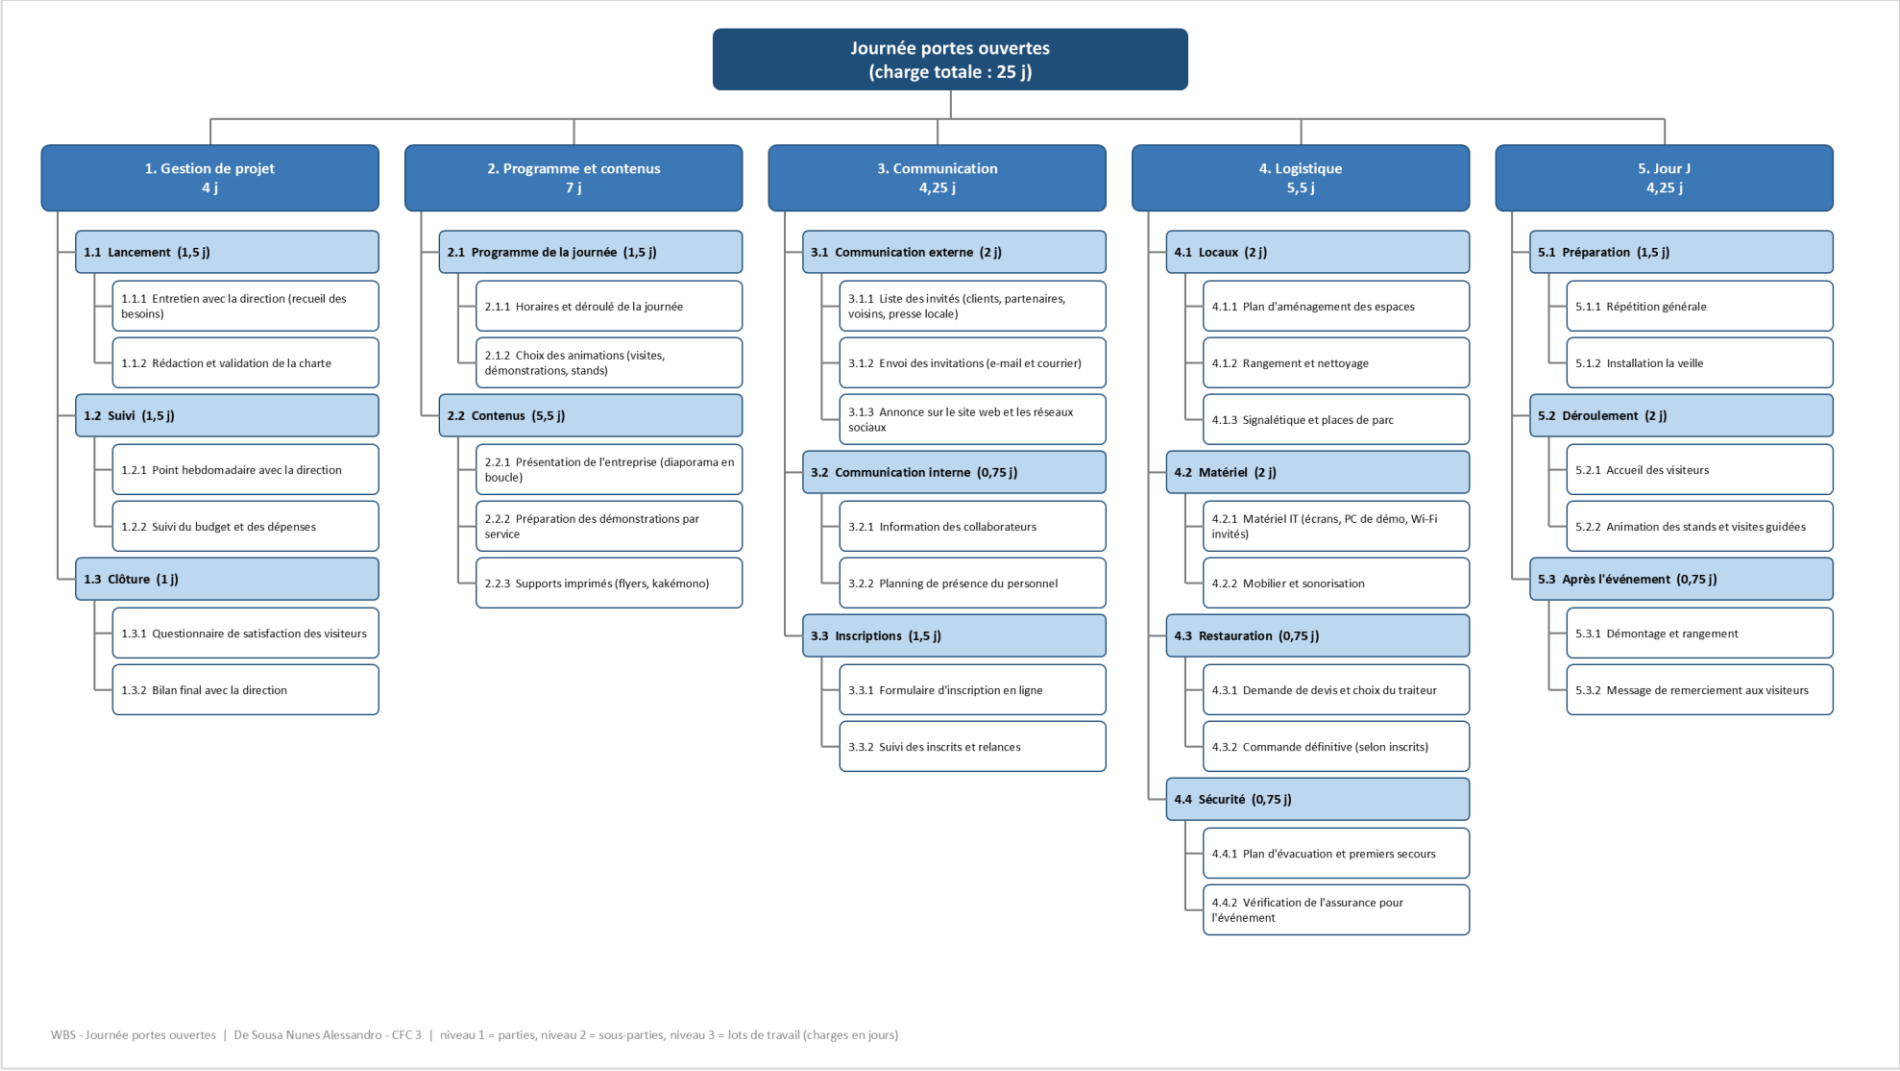

Planning Gantt et chemin critique

ID	Tâche	Durée (j)	Prédécesseurs	Début (j)	Fin (j)	Date début	Date fin	Fin au plus tard	Début au plus tard	Marge (j)	Critique
A	Cadrage et réunion de lancement	2	-	0	2	02.11.2026	03.11.2026	2	0	0	Oui
B	Analyse détaillée des besoins	4	A	2	6	04.11.2026	09.11.2026	6	2	0	Oui
C	Maquettes de l'interface	5	B	6	11	10.11.2026	16.11.2026	11	6	0	Oui
D	Modèle de données	3	B	6	9	10.11.2026	12.11.2026	10	7	1	Non
E	Développement back-end (API, base)	8	D	9	17	13.11.2026	24.11.2026	18	10	1	Non
F	Développement front-end	7	C	11	18	17.11.2026	25.11.2026	18	11	0	Oui
G	Intégration front / back	3	E, F	18	21	26.11.2026	30.11.2026	21	18	0	Oui
H	Tests et recette client	4	G	21	25	01.12.2026	04.12.2026	25	21	0	Oui
I	Documentation utilisateur	3	G	21	24	01.12.2026	03.12.2026	25	22	1	Non
J	Formation des utilisateurs	2	H, I	25	27	07.12.2026	08.12.2026	27	25	0	Oui
K	Mise en production	1	J	27	28	09.12.2026	09.12.2026	28	27	0	Oui

Durée totale (jours ouvrés) :	**28**
Fin prévue du projet :	**09.12.2026**
Chemin critique :	**A > B > C > F > G > H > J > K**

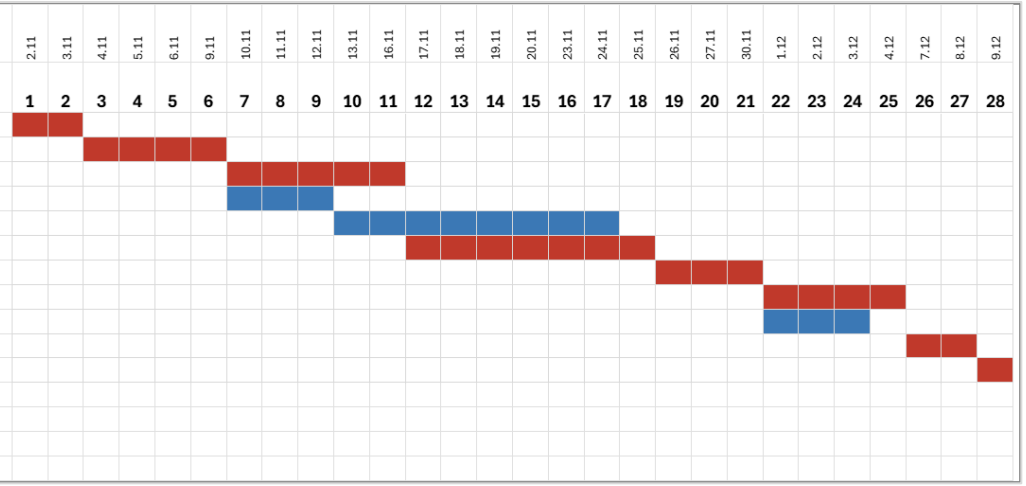


- Outil web de réservation de salles pour une fiduciaire : 11 tâches, 28 jours ouvrés, du 02.11 au 09.12.2026.
- Chemin critique A > B > C > F > G > H > J > K (branche interface) : un jour de retard sur ces tâches = un jour de retard sur le projet.

Vérification du planning

Test	Modification	Résultat	Conclusion
Contrôle	Aucune	28 jours	Somme du chemin critique = durée du projet
Test 1	Tâche D : 3 j -> 5 j	29 jours, fin 10.12	D et E deviennent critiques (marge de 1 j dépassée)
Test 2	Tâche F : 7 j -> 9 j	30 jours, fin 11.12	Plus aucune réserve avant la date limite du client

- Les tests ont été faits directement dans le fichier Excel, avec captures à l'appui.
- Point d'attention : la validation des maquettes (tâche C) dépend du client. Je propose de fixer la date de validation dès le lancement.


Analyse des risques : migration de la messagerie

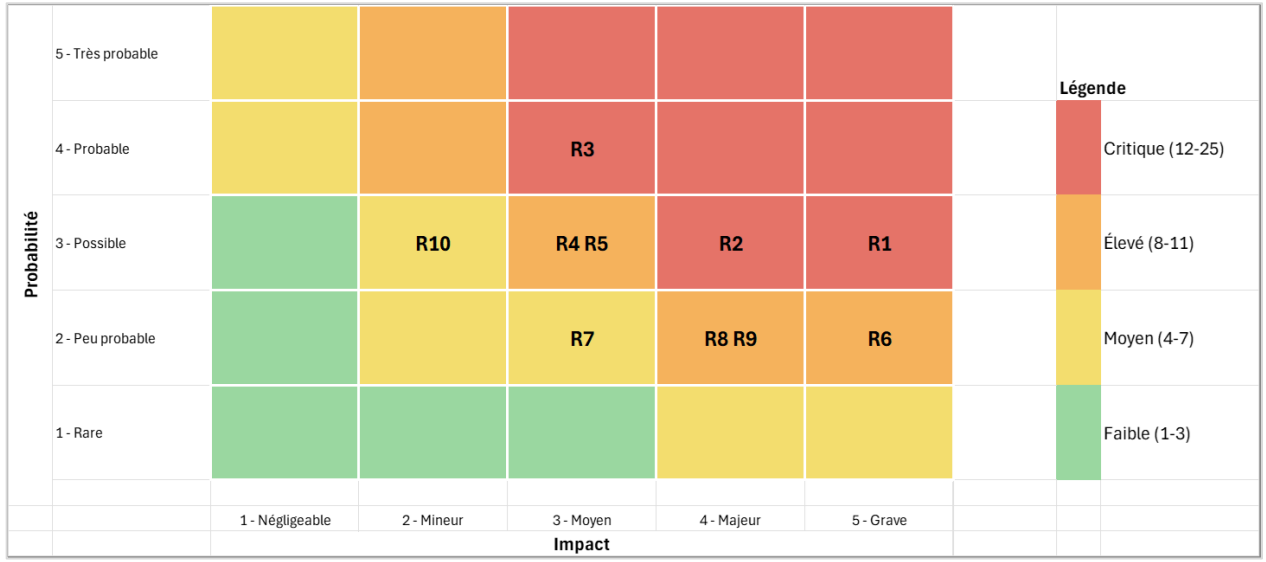

- 10 risques : 6 techniques, 2 organisationnels, 2 humains.
- Score = probabilité x impact. Matrice remplie automatiquement depuis le registre.
- R1 - Perte de courriels (15) : sauvegarde, migration pilote, contrôle avant/après.
- R2 - Coupure au basculement (12) : bascule le vendredi soir, TTL abaissé, retour arrière prêt.
- R3 - Utilisateurs perdus (12) : formation courte, guide d'une page, référents.
- Après les plans, les 3 risques passent au niveau moyen.

Sprint Scrum : rappels d'échéance

- 10 user stories avec critères d'acceptation, priorisées (MoSCoW) et estimées en points.
- Capacité : 3 développeurs x 5 jours. Engagement : 25 points (US-01 à US-08).
- Definition of Done : revue de code, tests, déploiement de test, acceptation du PO.
- Résultat : 23 points livrés sur 25. US-08 non terminée, remise dans le backlog.

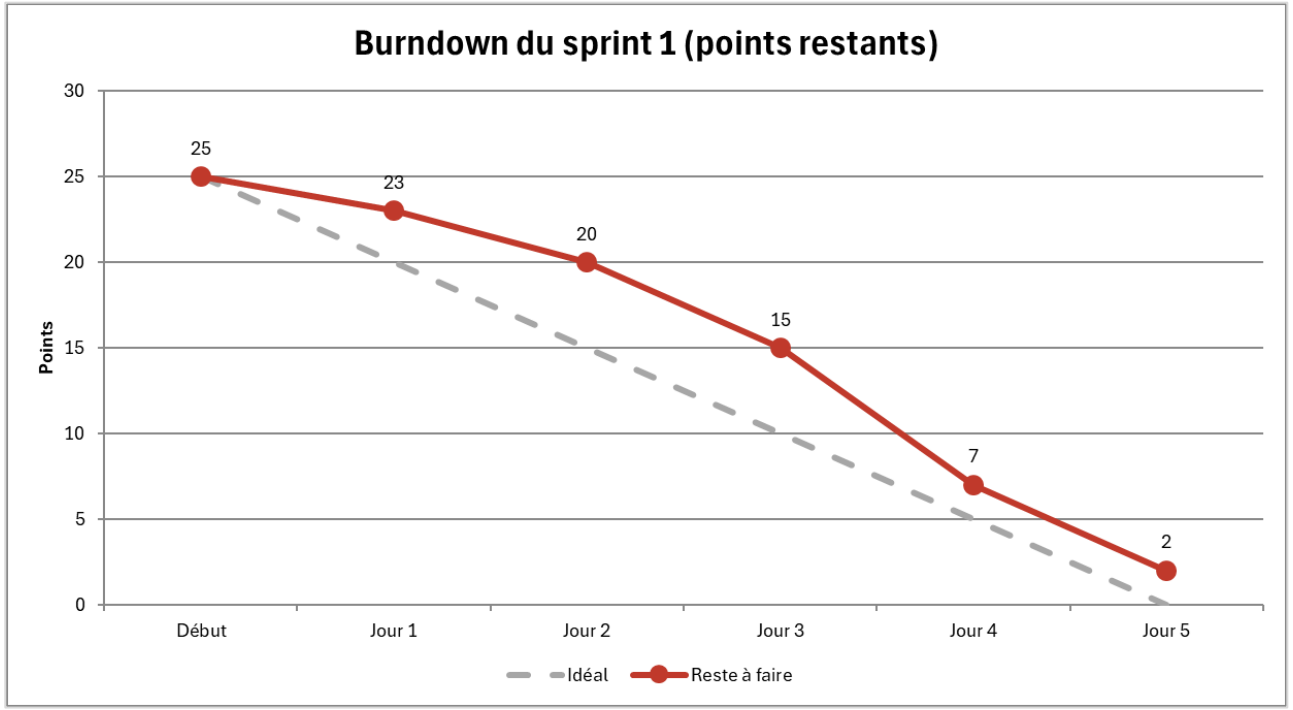

Revue et rétrospective

Revue de sprint


- Objectif du sprint atteint : rappels dans l'application et par e-mail.
- Démo : tâche avec échéance, notification, e-mail, préférences, tâche en retard.
- Retour utilisateurs : choisir l'heure du rappel -> nouvelle story.
- Vélocité : 23 points (92 %).

Rétrospective : actions

- Lister les dépendances externes (accès, comptes) dès le planning.
- Commencer par les grosses stories, maximum 2 en cours par développeur.
- Ne plus commencer une story qui ne peut pas être finie avant la fin du sprint.

Pilotage : wiki interne en 5 jours

- Budget de CHF 11'484 : heures x tarif de chaque rôle, plus une réserve de 10 %.
- Suivi chaque soir dans un tableau de bord Excel : écart de coût et statut calculés automatiquement.
- Deux comités de pilotage (J2 et J4) avec un rapport d'avancement.
- Résultat (simulé) : livré le J5, CHF 10'905, soit +465 pris sur la réserve.

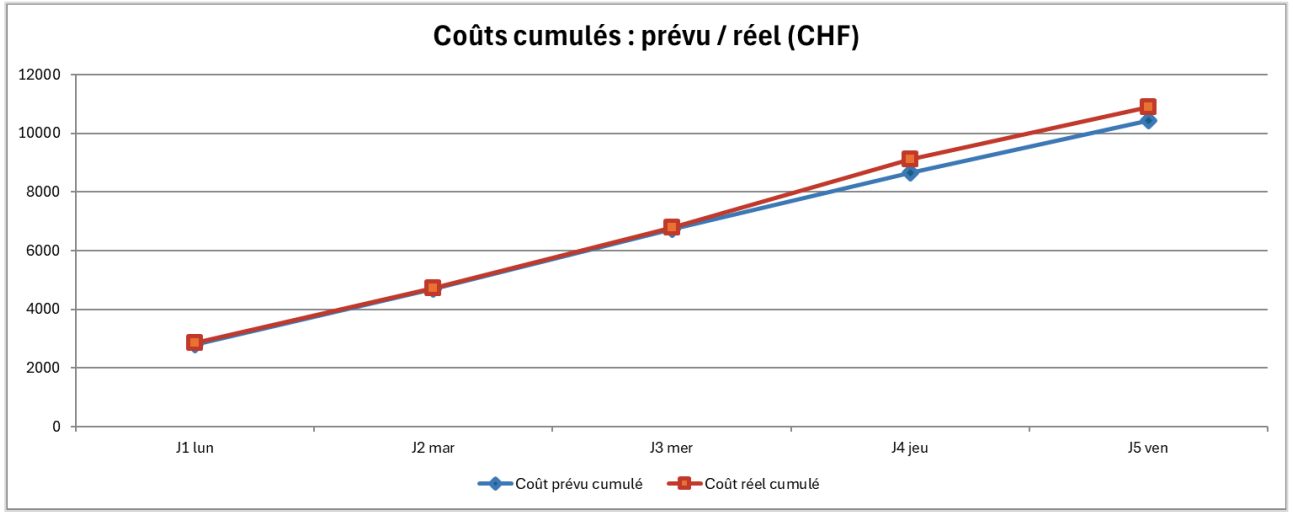

Gestion de l'aléa

J3 : l'administrateur système est malade (aléa simulé)

Option	Délai	Coût	Qualité
A - Tout décaler d'un jour	Fin le J6	~ +1'800	Inchangée
B - Le dév reprend les droits, l'admin finit le J4 (retenue)	**Fin le J5**	**+420**	**Inchangée**
C - Comptes locaux au lieu des comptes d'entreprise	Fin le J5	-400	Dégradée

- Option B : la seule qui garde la date de fin et la qualité. Le surcoût reste dans la réserve.
- Décision prise en moins d'une heure grâce au tableau de bord et à la réserve préparés à l'avance.

Ce que j'ai appris

- Un planning n'est utile que si on sait ce qui est critique : le chemin critique montre où un retard coûte vraiment.
- Des formules plutôt que des chiffres tapés à la main : on peut tester des scénarios et vérifier ses calculs.
- Les risques humains (absence, disponibilité) sont souvent sous-estimés : il faut prévoir des binômes et de la marge.
- Scrum : un objectif de sprint clair et une Definition of Done évitent les stories « presque finies ».
- Un bon suivi sert à décider vite, pas seulement à constater les problèmes.
