
Planning Gantt - Outil de réservation de salles (client : fiduciaire)

Début du projet : 02.11.2026 De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

ID	Tâche	Durée (j)	Prédécesseurs	Début (j)	Fin (j)	Date début	Date fin	Fin au plus tard	Début au plus tard	Marge (j)	Critique
A	Cadrage et réunion de lancement	2	-	0	2	02.11.2026	03.11.2026	2	0	0	Oui
B	Analyse détaillée des besoins	4	A	2	6	04.11.2026	09.11.2026	6	2	0	Oui
C	Maquettes de l'interface	5	B	6	11	10.11.2026	16.11.2026	11	6	0	Oui
D	Modèle de données	3	B	6	9	10.11.2026	12.11.2026	10	7	1	Non
E	Développement back-end (API, base)	8	D	9	17	13.11.2026	24.11.2026	18	10	1	Non
F	Développement front-end	7	C	11	18	17.11.2026	25.11.2026	18	11	0	Oui
G	Intégration front / back	3	E, F	18	21	26.11.2026	30.11.2026	21	18	0	Oui
H	Tests et recette client	4	G	21	25	01.12.2026	04.12.2026	25	21	0	Oui
I	Documentation utilisateur	3	G	21	24	01.12.2026	03.12.2026	25	22	1	Non
J	Formation des utilisateurs	2	H, I	25	27	07.12.2026	08.12.2026	27	25	0	Oui
K	Mise en production	1	J	27	28	09.12.2026	09.12.2026	28	27	0	Oui

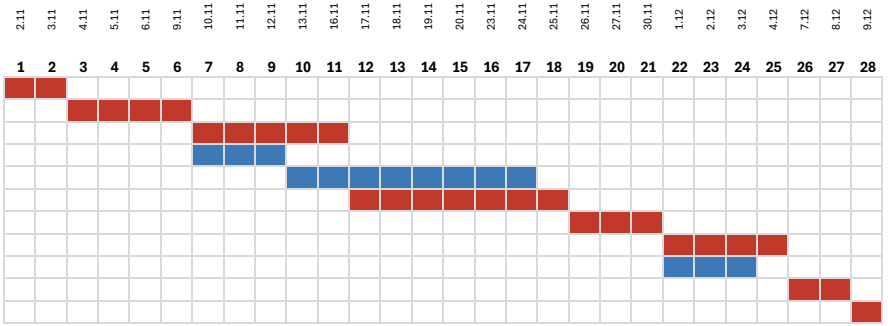

Durée totale (jours ouvrés) : **28**
Fin prévue du projet : **09.12.2026**
Chemin critique : **A > B > C > F > G > H > J > K**

Légende : rouge = tâche critique (marge 0), bleu = tâche avec marge. Dates, marges et chemin critique sont calculés par formules à partir des durées et des prédécesseurs.
